

RINGKASAN LAPORAN PROJEK LALULINTAS, PENGANGKUTAN AWAM DAN INFRASTRUKTUR



2023

Status pada 27 November 2023



RINGKASAN LAPORAN PROJEK 2023

PERUNTUKAN	BILANGAN PROJEK	JUMLAH PERUNTUKAN (RM)	STATUS				BELANJA	
			PERANCANGAN	PELAKSANAAN	SIAP	%SIAP	RM	%
MARRIS	116 (DETAIL A)	52,040,000.00	18 (DETAIL B)	24	74	63.8	9,252,781.58	17.78
KPKT	102	15,605,928.00	20	64	18	17.6	4,066,110.00	26.05
UPEN, P62	2	600,000.00	0	0	2	100	555,865.00	92.64
MEA, IKR	34	4,620,000.00	27	6	1	1	20,000.00	0.43
JUMLAH	254	72,865,928.00	65	94	95	37.4	13,894,756.58	19.07

DETAIL A	
KATEGORI	BILANGAN
TENDER	13
SEBUTHARGA / LANTIKAN TERUS	54
UNDI	49

DETAIL B	
KATEGORI	BILANGAN
DOKUMEN SH/TENDER	5
TELAH IKLAN SH/TENDER	-
PROSES RUNDINGAN/ KELULUSAN PKN	3
PROSES LANTIKAN	10



MARRIS



SENARAI KERJA UNDI – FASA 1

BIL	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS(%)
1	MENYELENGGARA LONGKANG SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI KG. BARU RAHANG, SEREMBAN	27.2.2023 22.5.2023 EOT 1 – 20.6.2023	100,000.00	100%
2	MENURAP SEMULA JALAN SERTA MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN TUANKU JAAFAR, SEREMBAN.	27.2.2023 22.5.2023 EOT 1 – 16.6.2023	100,000.00	100%
3	CADANGAN MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN PERMATA 1, SEREMBAN	27.2.2023 22.5.2023	100,000.00	100%
4	MENYELENGGARA LONGKANG DAN KERJA BERKAITAN DI TAMAN BUKIT CHEDANG, SEREMBAN.	27.2.2023 22.5.2023	100,000.00	100%
5	MENYELENGGARA PERABOT JALAN DI KAWASAN RASAH SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN BAGI MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN	27.2.2023 22.5.2023	100,000.00	100%
6	MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN SEREMBAN JAYA, SEREMBAN	27.2.2023 22.5.2023	100,000.00	100%
7	CADANGAN MENYELENGGARA LONGKANG SERTA YANG BERKAITAN DI TAMAN BUNGA RAYA SILIAU DAN YANG BERHAMPIRAN, RANTAU, SEREMBAN.	27.2.2023 22.5.2023	100,000.00	100%
8	MENURAP SEMULA JALAN DAN MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN SENANGIN, SEREMBAN.	27.2.2023 22.5.2023	100,000.00	100%
9	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN BBN 5/1, TAMAN DESA JASMIN, NILAI, NSDK	MULA 14.03.2023 SIAP 09.05.2023	99,476.77	100%
10	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN 15/6, BANDAR TASIK SENANGIN, LENGGENG, NSDK	MULA 14.03.2023 SIAP 09.05.2023	99,938.70	100%

SENARAI KERJA UNDI – FASA 1

BIL	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS(%)
11	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENGECAT RAILING SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN TASIK SENANGIN 8/7, BANDAR TASIK SENANGIN, LENGGENG, NSDK	MULA 14.03.2023 SIAP 09.05.2023	RM 99,962.00	100%
12	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI PERSIARAN TASIK SENANGIN 1, BANDAR TASIK SENANGIN, LENGGENG, NSDK	MULA 14.03.2023 SIAP 09.05.2023	RM 99,948.50	100%
13	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN NILAI SQUARE, NILAI, NSDK	MULA 14.03.2023 SIAP 09.05.2023	RM 99,882.90	100%
14	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI LAMAN LILI, NILAI IMPIAN, NILAI, NSDK	MULA 14.03.2023 SIAP 09.05.2023	RM 99,762.00	100%
15	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI LAMAN DELFINA, NILAI IMPIAN, NILAI, NSDK	MULA 14.03.2023 SIAP 09.05.2023	RM 99,868.00	100%
16	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI LAMAN AKASIA, NILAI IMPIAN, NILAI, NSDK	MULA 14.03.2023 SIAP 09.05.2023	RM 99,993.31	100%
17	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN PERSIARAN PERBANDARAN, NILAI, NSDK	MULA 14.03.2023 SIAP 09.05.2023	RM 99,993.80	100%
18	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN BBN 11/4, DESA MELATI, NILAI, NSDK	MULA 14.03.2023 SIAP 09.05.2023	RM 99,237.97	100%
19	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN KBP 4, KG.BARU PAJAM, MANTIN, NSDK	MULA 14.03.2023 SIAP 09.05.2023	RM 99,865.00	100%
20	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN TA 3, TAMAN ASOKA, MANTIN, NSDK	MULA 14.03.2023 SIAP 09.05.2023	RM 99,790.00	100%

SENARAI KERJA UNDI – FASA 1

BIL	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS(%)
21	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN MEKANIKAL, NILAI 3, NILAI, NSDK	MULA 14.03.2023 SIAP 23.05.2023	RM 99,992.00	100%
22	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN MEDANG 1, TAMAN MEDANG, MANTIN, NSDK	MULA 14.03.2023 SIAP 09.05.2023	RM 99,820.00	100%
23	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI KG. BARU SRI LABU, LABU, NSDK	MULA 14.03.2023 SIAP 23.05.2023	RM 99,978.00	100%
24	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN GADONG JAYA, LABU, NSDK	MULA 14.03.2023 SIAP 23.05.2023	RM 99,903.90	100%
25	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI LAMAN KEMBOJA, KOTA SERIMAS, NILAI, NSDK	MULA 14.03.2023 SIAP 23.05.2023	RM 99,692.00	100%
26	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI LAMAN ALAMANDA, KOTA SERIMAS, NILAI, NSDK	MULA 14.03.2023 SIAP 23.05.2023	RM 99,950.00	100%
27	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN GADONG JAYA, LABU, NSDK	MULA 14.03.2023 SIAP 23.05.2023	RM 99,978.00	100%

SENARAI KERJA UNDI – FASA 2

BIL	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS(%)
1	MEMBAIKPULIH DAN MENYELENGGARA LONGKANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN BUKIT MUTIARA, SEREMBAN	MULA -10.8.2023 SIAP- 2.11.2023	100,000.00	100%
2	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA- KERJA BERKAITAN DI TAMAN JASPER JAYA,SEREMBAN	MULA -10.8.2023 SIAP- 2.11.2023	100,000.00	100%
3	CADANGAN MEMBAIKPULIH TEBING RUNTUH DAN MENYELENGGARA LONGKANG DI TAMAN BUKIT TEMBOK, SEREMBAN	MULA -10.8.2023 SIAP- 2.11.2023	100,000.00	100%
4	CADANGAN MENURAP JALAN DAN MENYELENGGARA LONGKANG DI LORONG LABU JAYA 7, TAMAN LABU JAYA DAN YANG BERHAMPIRAN, SEREMBAN	MULA -10.8.2023 SIAP- 2.11.2023	100,000.00	100%
5	MENYELENGGARA LONGKANG DAN KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN RASAH JAYA, SEREMBAN.	MULA -10.8.2023 SIAP- 2.11.2023	100,000.00	90%
6	MENYELENGGARA LONGKANG DAN KERJA YANG BERKAITAN DI KAWASAN SEREMBAN 2, SEREMBAN.	MULA -10.8.2023 SIAP- 2.11.2023	100,000.00	95%
7	KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA BERKAITAN DI TAMAN SEREMBAN JAYA (FASA 10), SEREMBAN	MULA -10.8.2023 SIAP- 2.11.2023	100,000.00	100%
8	KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA BERKAITAN DI TAMAN SEREMBAN SELATAN, SEREMBAN	MULA -21.8.2023 SIAP- 30.11.2023	100,000.00	100%
9	KERJA-KERJA ROADMARKING SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN SRI PENAGA 2, SEREMBAN	MULA -21.8.2023 SIAP- 30.11.2023	100,000.00	100%
10	KERJA-KERJA MENYELENGGARA LONGKANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN EKAR 1/5, TAMAN BANDAR EKAR DAN YANG BERHAMPIRAN, RANTAU	MULA -21.8.2023 SIAP- 30.11.2023	100,000.00	100%

SENARAI KERJA UNDI – FASA 2

BIL	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS(%)
11	KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH RAILING SERTA KERJA BERKAITAN DI TAMAN BUKIT EMAS, SEREMBAN	MULA -21.8.2023 SIAP- 30.11.2023	100,000.00	100%
12	MENYELENGGARA LONGKANG DAN KERJA YANG BERKAITAN DI KAMPUNG BARU MAMBAU, SEREMBAN	MULA -21.8.2023 SIAP- 30.11.2023	100,000.00	90%
13	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT JALAN SERTA KERJA YG BERKAITAN DI JALAN UTAMA BANDAR UNIVERSITI TEKNOLOGI LAGENDA, MANTIN	MULA 16.08.2023 SIAP 25.10.2023	RM 99,820.00	100%
14	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA YG BERKAITAN DI TAMAN ANGGERIK, PAJAM	MULA 16.08.2023 SIAP 25.10.2023	RM 99,860.25	100%
15	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG DAN TEMBOK LONGKANG SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN DATO' SHAHARDIN, LABU, NSDK	MULA 16.08.2023 SIAP 25.10.2023	RM 99,809.82	100%
16	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN GADONG INDAH, LABU, NSDK	MULA 16.08.2023 SIAP 25.10.2023	RM 99,940.00	100%
17	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG DAN TEMBOK LONGKANG SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN GADONG JAYA, LABU, NSDK	MULA 16.08.2023 SIAP 25.10.2023	RM 99,798.40	100%
18	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT JALAN SERTA KERJA BERKAITAN DI JALAN PERSIARAN TASIK SENANGIN 1, BANDAR TASIK SENANGIN, LENGGENG, NSDK	MULA 16.08.2023 SIAP 11.10.2023	RM 99,980.00	100%
19	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA BERKAITAN DI JALAN TASIK SENANGIN 18/2, BANDAR TASIK SENANGIN, LENGGENG, NSDK	MULA 16.08.2023 SIAP 11.10.2023	RM 99,997.24	100%
20	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT JALAN SERTA KERJA BERKAITAN DI JALAN TS UTAMA, TAMAN SEMARAK, NILAI, NSDK	MULA 16.08.2023 SIAP 11.10.2023	RM 99,862.91	100%

SENARAI KERJA UNDI – FASA 2

BIL	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS(%)
21	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH TEMBOK LONGKANG SERTA KERJA BERKAITAN DI TAMAN DESA JASMIN, NILAI, NSDK	MULA 16.08.2023 SIAP 11.10.2023	RM 99,947.16	100%
22	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT JALAN SERTA KERJA BERKAITAN DI TAMAN DESA MELATI, NILAI, NSDK	MULA 16.08.2023 SIAP 11.10.2023	RM 99,650.95	100%


SENARAI KERJA SEBUTHARGA

(KELULUSAN KHAS)

BIL	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS(%)
1	MEMBAIKPULIH CERUN RUNTUH SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN TASIK JAYA, SEREMBAN	MULA – 10.4.2023 SIAP – 30.7.2023	RM 295,000.00	100%

PROJEK MARRIS SIRI 1/2023

(kelulusan 19.4.2023)

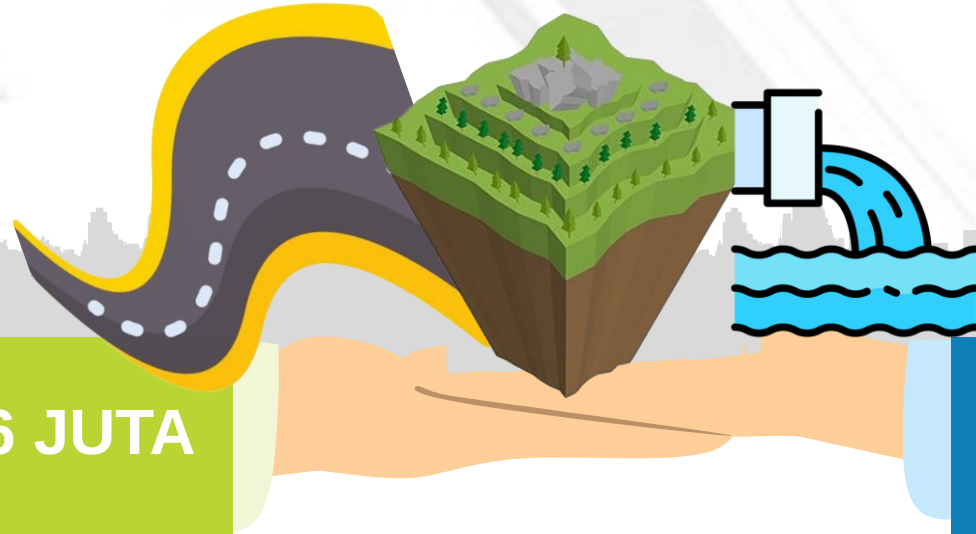

PEJABAT UTAMA

RM16.6 JUTA

RM21.1 JUTA

CAWANGAN NILAI



JUMLAH KESELURUHAN = RM37.7 JUTA

SENARAI KERJA TENDER

(kelulusan 19.4.2023)

BIL	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS(%)
1	MEMBAIKPULIH CERUN JALAN DAN KERJA -KERJA BERKAITAN DI JALAN BUKIT BERLIAN, SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN	-	-	DALAM PROSES LANTIKAN KONTRAKTOR
2	MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN SIKAMAT, SEREMBAN	MULA 27.11.2023 SIAP 18.03.2024	980,000	0%
3	CADANGAN MEMBAIKPULIH LONGKANG DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN TUANKU ANTAN, BANDAR SEREMBAN, SEREMBAN	MULA 27.11.2023 SIAP 13.05.2024	1,000,000	0%
4	CADANGAN MEMBAIKPULIH CERUN RUNTUH DI JALAN DESA DAHLIA 2, TAMAN DESA DAHLIA, SEREMBAN	-	-	DLM PERINGKAT REKABENTUK PERUNDING (NRSB)

SENARAI KERJA TENDER

(kelulusan 19.4.2023)

BIL	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS(%)
1.	CADANGAN KERJA-KERJA PEMBAIKAN CERUN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI RUMAH RAKYAT BATANG BENAR, MANTIN, NSDK	-	-	DALAM PROSES LANTIKAN KONTRAKTOR
2.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI KAWASAN PERINDUSTRIAN RINGAN BATU 8, MANTIN, NSDK	-	-	DALAM PROSES LANTIKAN KONTRAKTOR
3.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG DAN PERABOT JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN ASOKA, MANTIN, NSDK	-	-	DALAM PROSES LANTIKAN KONTRAKTOR
4.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN BBN 1/3 DAN JALAN BBN 1/4, PUTRA POINT, NILAI, NSDK	-	-	DALAM PROSES LANTIKAN KONTRAKTOR
5.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN ANDALAS, MANTIN, NSDK	-	-	DALAM PROSES LANTIKAN KONTRAKTOR
6.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI SEBAHAGIAN JALAN PERSIARAN PERDANA, NILAI, NSDK	-	-	DALAM PROSES LANTIKAN KONTRAKTOR
7.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI KAWASAN PERINDUSTRIAN ARAB MALAYSIAN, NILAI, NSDK	-	-	DALAM PROSES LANTIKAN KONTRAKTOR

SENARAI KERJA SEBUTHARGA

(kelulusan 19.4.2023)

BIL	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS(%)
1	MENURAP JALAN DAN MENYELENGGARA TEMBOK RUNTUH SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN LABU JAYA, BUKIT KEPAYANG, SEREMBAN	MULA- 27.11.2023 SIAP – 19.2.2024	RM495,000.00	0%
2	KERJA-KERJA PENGUKUHAN CERUN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN WARISAN PUTERI A40, TAMAN WARISAN PUTERI, SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS	-	-	DLM PERINGKAT REKABENTUK PERUNDING (NRSB)
3	MENURAP SEMULA JALAN DAN MEMBAIKPULIH TEMBOK SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI DESA KIARA INDAH, SEREMBAN	-	-	DLM PERINGKAT REKABENTUK PERUNDING (NRSB)
4	MENYELENGGARA GUARDRAIL DAN KERJA BERKAITAN DI TAMAN NURI INDAH SERTA LAIN-LAIN KAWASAN DALAM PENTADBIRAN MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN	MULA – 7.8.2023 SIAP – 2.10.2023	RM 96,500.00	100%
5	MENYELENGGARA LONGKANG SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN TAMAN SEREMBAN JAYA (FASA 9), SEREMBAN	MULA- 27.11.2023 SIAP – 21.1.2024	RM198,000.00	0%
6	MENURAP JALAN SERTA MENYELENGGARA LONGKANG DAN YANG BERKAITAN DI TAMAN BUKIT KELISA, BUKIT KEPAYANG, SEREMBAN	MULA- 27.11.2023 SIAP – 19.2.2024	RM 298,000.00	0%
7	MENYELENGGARA LONGKANG DAN KERJA YANG BERKAITAN DI RASAH KEMAYAN, SEREMBAN	MULA – 7.8.2023 SIAP – 27.11.2023 EOT – 8/1/2024	RM 485,000.00	60%
8	MENYELENGGARA LONGKANG DAN KERJA YANG BERKAITAN DI OAKLAND, SEREMBAN 2, SEREMBAN	MULA- 27.11.2023 SIAP – 18.3.2024	RM 440,000.00	0%
9	MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN TUNKU HASSAN, BANDAR SEREMBAN, SEREMBAN	MULA- 27.11.2023 SIAP – 18.3.2024	RM 495,000.00	0%
10	MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN MURUGESU, SEREMBAN	MULA – 10.8.2023 SIAP – 2.11.2023	RM 191,100.00	100%

SENARAI KERJA SEBUTHARGA

(kelulusan 19.4.2023)

BIL	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS(%)
11	MENYELENGGARA LONGKANG SERTA KERJA BERKAITAN DI TAMAN ANGSAMAS SERTA LAIN-LAIN KAWASAN DALAM PENTADBIRAN MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN	MULA – 7.8.2023 SIAP – 2.10.2023	RM194,420.00	80%
12	MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI PEKAN SENAWANG JAYA, TAMAN SENAWANG JAYA, SEREMBAN	MULA- 27.11.2023 SIAP – 21.1.2024	RM 298,000.00	0%
13	CADANGAN MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI OFF JALAN TUAN HAJI SAID (LAKE HEIGHT), SEREMBAN	MULA - 10.7.2023 SIAP - 2.10.2023	191,770.00	100%
14	CADANGAN MENYELENGGARA CERUN DAN YANG BERKAITAN DI TAMAN SRI ANGGERIK, RANTAU, SEREMBAN	MULA – 2.12.2022 SIAP – 7.4.2022	RM 481,900.00	100%
15	CADANGAN PENYELENGGARAAN LONGKANG MENGIKUT BP 1 BAGI MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN	MULA – 2.10.2023 SIAP – 30.09.2024	350,000.00	20%
16	MENURAP SEMULA JALAN DAN KERJA BERKAITAN DI JALAN SAUJANA SUTERA S2 HEIGHTS, SEREMBAN	MULA – 7.8.2023 SIAP – 27.11.2023	RM196,360.00	100%
17	MENURAP SEMULA JALAN DAN KERJA BERKAITAN DI TAMAN PUNCA EMAS, SEREMBAN	MULA- 27.11.2023 SIAP – 19.2.2024	RM 190,000.00	0%
18	MENURAP SEMULA JALAN DAN KERJA BERKAITAN DI TAMAN RASAH JAYA, SEREMBAN	MULA – 7.8.2023 SIAP – 30.10.2023	RM192,180.00	85%
19	MENURAP SEMULA JALAN DAN KERJA BERKAITAN DI TAMAN UJONG, SEREMBAN	MULA – 7.8.2023 SIAP – 27.11.2023	RM194,800.00	100%
20	CADANGAN PENYELENGGARAAN LONGKANG MENGIKUT BP 4(2) BAGI MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN	MULA – 2.10.2023 SIAP – 1.10.2024	RM300,000.00	20%

SENARAI KERJA SEBUTHARGA

(kelulusan 19.4.2023)

BIL	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS(%)
21	CADANGAN PENYELENGGARAAN LONGKANG MENGIKUT BP 4(1) BAGI MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN	MULA – 2.10.2023 SIAP – 1.10.2024	300,000.00	20%
22	CADANGAN PENYELENGGARAAN LONGKANG MENGIKUT BP 2 BAGI MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN	MULA – 2.10.2023 SIAP – 30.09.2024	300,000.00	20%
23	CADANGAN PENYELENGGARAAN LONGKANG MENGIKUT BP 5 BAGI MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN	MULA – 2.10.2023 SIAP – 30.09.2024	250,000.00	20%
24	CADANGAN MENGECAT SEMULA GARISAN JALAN DI KAWASAN BP 3 BAGI MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN	MULA – 7.8.2023 SIAP – 29.10.2023	294,560.00	100%
25	CADANGAN MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN NEE YAN, JALAN TEMIANG, SEREMBAN	MULA 18.05.2023 SIAP 07.09.2023	192,570.00	100%
26	CADANGAN MEMBAIKPULIH CERUN RUNTUH SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN PERMAI FASA 2, SEREMBAN	14.11.2022 13.02.2023	310,000.00	100%
27	CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK AMENITI BERISIKO DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI PERSIARAN PERDANA DAN PERSIARAN GOLF, PUTRA NILAI, DALAM KAWASAN MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS	MULA 2/10/2023 SIAP 26.11.2023	94,350.00	100%
28	CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK AMENITI BERISIKO DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAWASAN PERINDUSTRIAN NILAI 1 DAN NILAI 2, DALAM KAWASAN MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS	MULA 2/10/2023 SIAP 26/11/2023	93,650.00	100%
29	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK UTAMA DAN KERJA BERKAITAN BAGI BLOK PEMBANGUNAN 4 (ZON 3) DI DALAM KAWASAN MBS	MULA 14.09.2023 SIAP 08.11.2023	90,350.00	100%
30	KERJA-KERJA PENYELENGGAARAN POKOK UTAMA DAN KERJA-KERJA BERKAITAN BAGI BLOK PEMBANGUNAN 4 (ZON 1) DI DALAM KAWASAN MBS	MULA 01.08.2023 SIAP 25.09.2023	89,870.00	100%

SENARAI KERJA SEBUTHARGA

(kelulusan 19.4.2023)

BIL	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS(%)
31	KERJA-KERJA PENYELENGGAARAN POKOK UTAMA DAN KERJA-KERJA BERKAITAN BAGI BLOK PEMBANGUNAN 3 (ZON 5) DI DALAM KAWASAN MBS	MULA 21.10.2023 SIAP 26.11.2023	91,650.00	100%
32	KERJA-KERJA PENYELENGGAARAN POKOK UTAMA DAN KERJA-KERJA BERKAITAN BAGI BLOK PEMBANGUNAN 3 (ZON 4) DI DALAM KAWASAN MBS	MULA 01.09.2023 SIAP 26.10.2023	88,450.00	100%
33	KERJA-KERJA PENYELENGGAARAN POKOK UTAMA DAN KERJA-KERJA BERKAITAN BAGI BLOK PEMBANGUNAN 2 (ZON 1) DI DALAM KAWASAN MBS	MULA 01.09.2023 SIAP 26.10.2023	90,050.00	100%
34	KERJA-KERJA PENYELENGGAARAN POKOK UTAMA DAN KERJA-KERJA BERKAITAN BAGI BLOK PEMBANGUNAN 2 (ZON 5) DI DALAM KAWASAN MBS	MULA 01.09.2023 SIAP 26.10.2023	87,980.00	100%
35	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN RASAH KEMAYAN ZON 1 (FASA 1, FASA 2 DAN FASA 3), SEREMBAN	MULA 01.08.2023 SIAP 25.09.2023	91,370.00	100%
36	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN RASAH KEMAYAN ZON 2 (FASA 4, FASA 5 DAN FASA 6), SEREMBAN	MULA 01.08.2023 SIAP 25.09.2023	90,000.00	100%

SENARAI KERJA SEBUTHARGA

(kelulusan 19.4.2023)


BIL	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS(%)
1.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN BBN 6/2C, TAMAN DESA CEMPAKA, NILAI, NSDK	MULA - 02.08.2023 SIAP - 13.09.2023	RM 176,137.00	100%
2.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN PERSIARAN KORPORAT, NILAI, NSDK	MULA - 02.08.2023 SIAP - 27.09.2023	RM 185,530.00	100%
3.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI RUMAH RAKYAT MANTIN, MANTIN, NSDK	MULA - 02.08.2023 SIAP - 25.10.2023	RM 452,690.00	50%
4.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN TS 2/1, TAMAN SEMARAK, NILAI, NSDK	MULA - 02.08.2023 SIAP - 25.10.2023	RM 181,720.00	100%
5.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH TEMBOK PENAHAN DAN LONGKANG SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI PERUMAHAN SEKITAR MANTIN, NSDK	MULA - 02.08.2023 SIAP - 11.10.2023	RM 461,415.00	100%

SENARAI KERJA RUNDINGAN TERUS (kelulusan 24.5.2023 (RM500K))

BIL	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS(%)
1.	MENYELENGGARA LONGKANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN CEMPAKA, SEREMBAN.	MULA -21.8.2023 SIAP- 30.11.2023	100,000.00	100%
2.	CADANGAN MEMBAIKPULIH LONGKNAG DAN YANG BERKAITAN DI JALAN KURAU 9, TAMAN PERMAI FASA 1, BUKIT KEPAYANG, SEREMBAN.	MULA -21.8.2023 SIAP- 30.11.2023	100,000.00	100%
3.	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA YANG BERKAITAN DI JALAN KENARI PAROI, SEREMBAN.	MULA -21.8.2023 SIAP- 30.11.2023	100,000.00	100%
4.	CADANGAN MENYELENGGARA LONGKANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN PENGHULU CANTIK, SEREMBAN.	MULA -21.8.2023 SIAP- 30.11.2023	100,000.00	95%
5.	MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN DESA ORKID, SEREMBAN	MULA -21.8.2023 SIAP- 30.11.2023	100,000.00	65%

TENDER RUNDINGAN TERUS (14.6.2023)

BIL	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS(%)
1.	CADANGAN MEMBAIKPULIH CERUN RUNTUH DI TAMAN SAGA, LOBAK, DAERAH SEREMBAN, NEGERI SEMVILAN.	MULA – 21.8.2023 SIAP – 1.4.2024	RM 3,100,000.00	55%

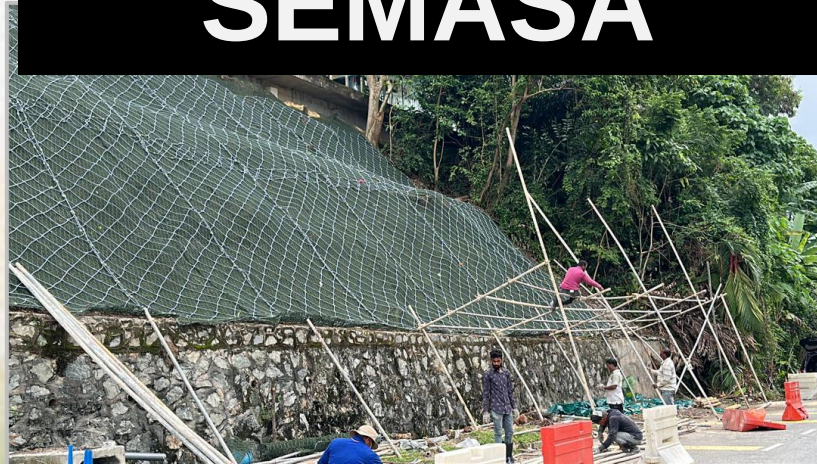

LANTIKAN TERUS, SEBUTHARGA, TENDER

MESY MARRIS BIL.2/2023, 26.10.2023

BIL	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS(%)
LANTIKAN TERUS				
1	Cadangan Kerja-kerja Penyelenggaraan Pokok dan Kerja-Kerja Berkaitan di Taman Koop, Seremban.	-	-	Dlm proses lantikan
2	Cadangan Kerja-kerja Penyelenggaraan Pokok dan Kerja-Kerja Berkaitan di Taman Bukit Labu, Seremban.	-	-	Dlm proses lantikan
SEBUTHARGA				
1	MEMBAIKPULIH TEMBOK RUNTUH DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN PERSIARAN SEREMBAN TIGA FASA 1, SEREMBAN	-	-	Penyediaan Dokumen sebutharga
2	CADANGAN MEMBAIKPULIH CERUN RUNTUH DAN MENYELENGGARA LONGKANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN DATO' KELANA MAAMOR, SEREMBAN	-	-	Dokumen sebutharga
3	CADANGAN MENYELENGGARA LONGKANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN KILAT 2, SEREMBAN	-	-	Dokumen sebutharga
4	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH CERUN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI PAROI JAYA, SEREMBAN	-	-	Dokumen sebutharga
TENDER				
1	KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH RUNTUHAN CERUN DI TAMAN CHIP AIK, SEREMBAN DAN LAIN- LAIN KERJA BERKAITAN	-	-	Penyediaan Dokumen Tender
2	CADANGAN PEMBAIKAN CERUN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN NURI INDAH 3, RASAH, NEGERI SEMBILAN.	-	-	Penyediaan Dokumen Tender



KPKT




SENARAI 2/2023

(kelulusan 25.1.2023)

BIL	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS(%)
1	Membina Baru Kiosk Di Kawasan Majlis Bandaraya Seremban.	Mula - 20.03.2023 Siap -10.7.2023 EOT 1 – 29.8.2023 EOT 2 – 27.09.2023	280,000.00	100%



1 REKA BENTUK 1

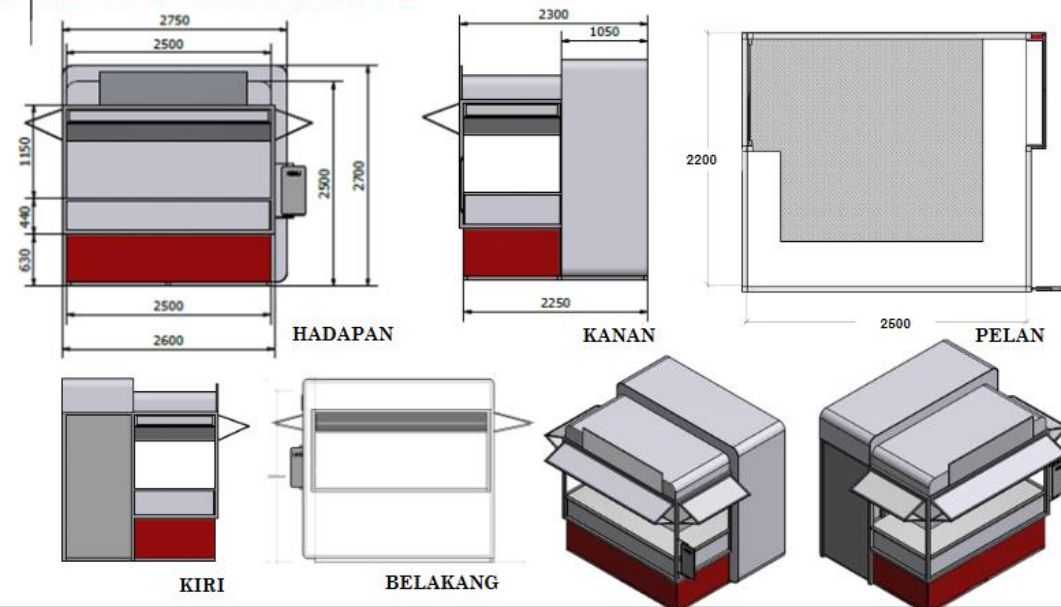

1 | skema warna



Kod Warna



Kod Warna





Kod Warna



Kod Warna



1 | komponen

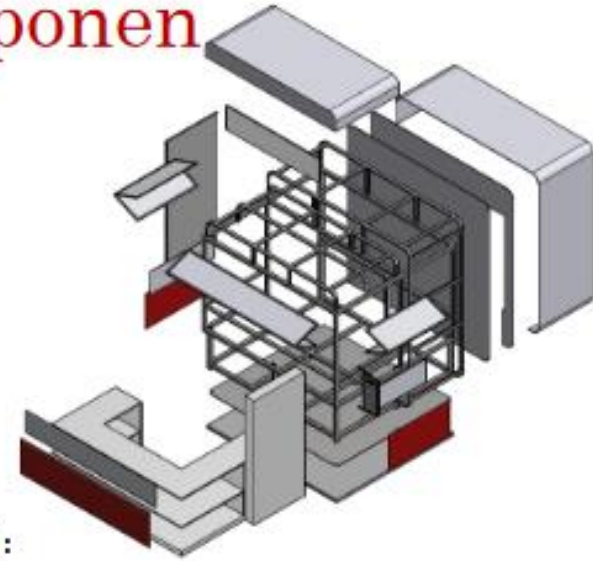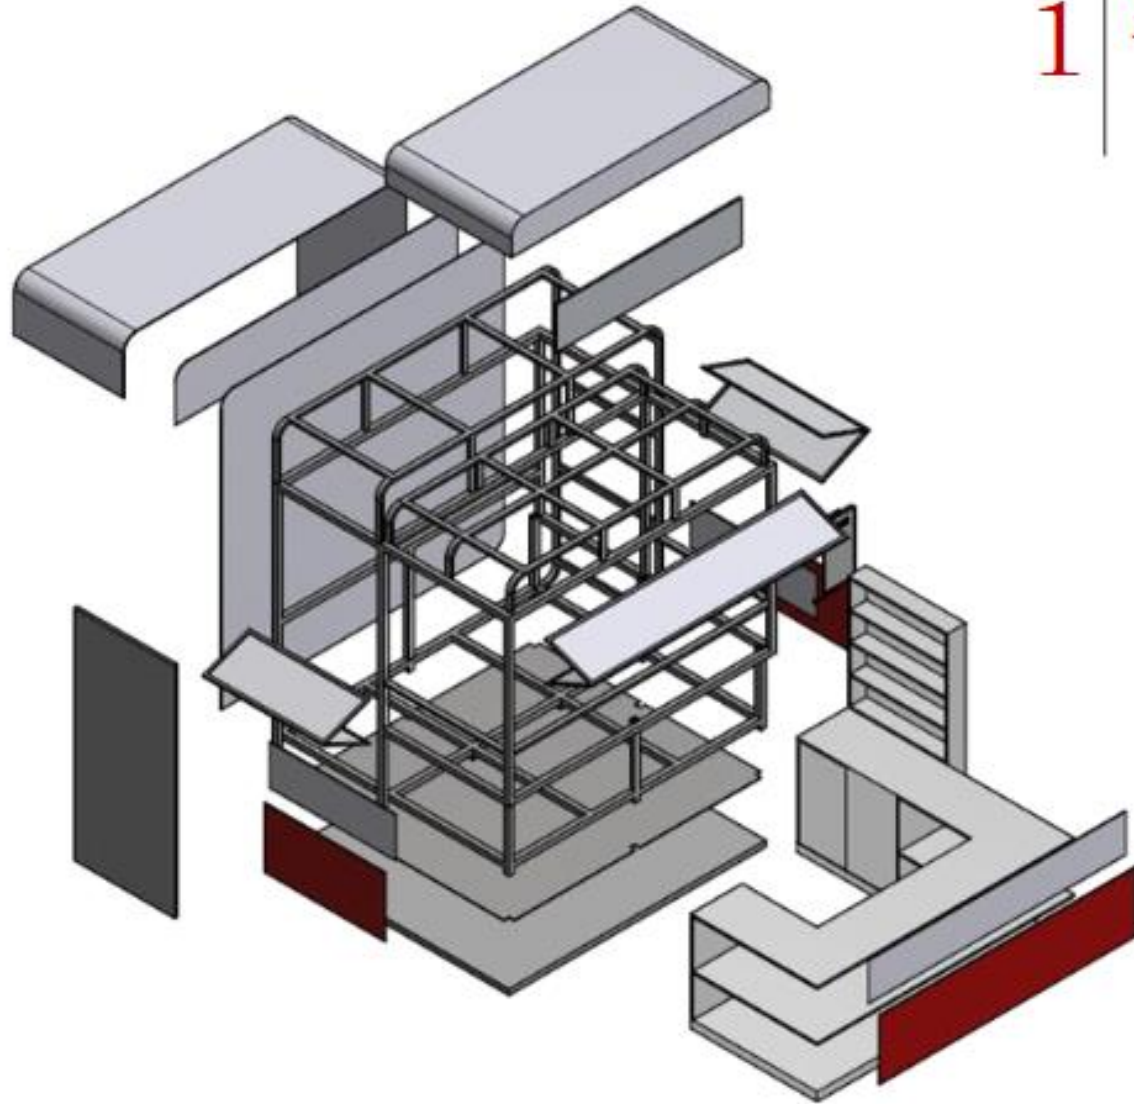

Material :

1. **Dinding**
4mm tebal FRP plate sheet
2. **Lantai**
20mm tebal FRP moulded grating termasuk 3mm tebal chequer plate sebagai kemasan permukaan
3. **Bumbung**
3mm tebal FRP plate sheet
4. **Pintu**
Pintu FRP termasuk struktur dan bingkai
6. **Tingkap**
Tingkap panel HDG termasuk struktur dan bingkai
7. **Perabot**
4mm tebal ACP plate sheet meja kaunter, struktur sokongan, rak dan cabinet dengan kemasan 9mm tebal OSB board.

SENARAI 6/2023 (kelulusan 12.4.2023)

BIL	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS(%)
1	Menyelenggara dan Menaiktaraf Pasar Rasah Jaya, MB Seremban.	MULA -3.7.2023 SIAP – 2.10.2023	RM 649,505.00	80%

SENARAI 7/2023 (Kelulusan 02.5.2023)

BIL	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS(%)
1	Menaiktaraf Padang Lobak dan Kerja-Kerja Berkaitan, Seremban, MB Seremban	Mula - 20.06.2023 Siap -11.9.2023 EOT 1 – 11.11.2023	737,150.00	95%



SEMASA



SENARAI TPPM TAHUN 2023

(kelulusan 05.05.2023)

BIL	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS(%)
1	Kerja-kerja Menaiktaraf Tangki Air & Sistem Retikulasi dan Kerja-kerja Berkaitan Di Rumah Pangsa Senawang (Blok C, D & E)	Mula – 28.6.2023 Siap – 17.10.2023	RM 365,900.00	100%
2	Kerja-kerja Menaiktaraf Harta Bersama Dan Kerja-kerja Berkaitan Di Pangsapuri Nilam Court, Nilai Impian	Mula - 12.07.2023 Siap - 23.08.2023	RM 388,480.00	100%
3	Kerja-kerja Penggantian Satu (1) Unit Lif Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Pangsapuri Cempaka Court, Taman Desa Cempaka	Mula - 12.07.2023 Siap - 01.11.2023 EOT – 08.02.2024	RM 489,100.00	30%
4	Kerja-kerja Baikpulih Lima (5) Unit Lif Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Pangsapuri Desa Palma, Taman Desa Melati	Mula - 12.07.2023 Siap - 01.11.2023	RM 375,000.00	100%

SENARAI 8/2023

(kelulusan 22.5.2023)

BIL	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS(%)
1	Membaikpulih Kerosakan Am Serta Kerja-Kerja Berkaitan di Kompleks Penjaja Jalan Lee Sam, MB Seremban.	MULA- 3.7.2023 SIAP – 22.10.2023	RM778,160.00	60%
2	Menaiktaraf Bangunan Pasar Besar Seremban, MB Seremban.	MULA – 3.7.2023 SIAP – 22.10.2023 EOT – 5.11.2023	RM583,630.00	70%
3	Membaikpulih Kerosakan Am Serta Kerja-kerja Berkaitan Di Bazar Jalan Lee Sam, MB Seremban.	MULA- 3.7.2023 SIAP – 10.9.2023	RM217,880.00	100%



PROGRAM PROJEK PENYENGGAHAAN PERUMAHAN (PPP)

RM 2,487,964.00



PROGRAM PROJEK PENYENGGARAAN PERUMAHAN (PPP)

(kelulusan 22.5.2023)

BIL	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS(%)
1	KERJA-KERJA MENAIKTARAF 2 UNIT RUMAH SAMPAH SEDIADA DI PANGSAPURI RAKYAT (PPR) SERI PERDANA, PAROI	MULA – 31.7.2023 SIAP – 19.11.2023	60,000	100%
2	KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH KEROSAKAN AM (15 UNIT RUMAH) SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI PANGSAPURI RAKYAT (PPR) SERI PERDANA, PAROI	MULA – 31.7.2023 SIAP – 19.11.2023	130,550	100%
3	KERJA-KERJA MENUKAR DISTRIBUTION BOARD, LAMPU TANGGA DAN LAMPU JALAN DI PANGSAPURI RAKYAT (PPR) SERI PERDANA, PAROI	MULA – 4.9.2023 SIAP – 30.10.2023	200,850	100%
4	KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH KEBOCORAN BUMBUNG, LANTAI BILIK AIR DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI PANGSAPURI RAKYAT (PPR) SERI PERDANA, PAROI	MULA – 28.6.2023 SIAP – 17.10.2023	778,300	100%
5	KERJA-KERJA MEMBINA SATU UNIT RUMAH SAMPAH DI PPRT LOBAK, SEREMBAN	MULA – 31.7.2023 SIAP – 19.11.2023	41,000	100%
6	KERJA-KERJA MEMBINA PAGAR KESELAMTAN DI KELILING PPRT LOBAK, SEREMBAN	MULA – 31.7.2023 SIAP – 19.11.2023	318,120	100%
7	KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH KEROSAKAN AM DAN MENGGANTI KEROSAKAN SISTEM PEPASANGAN ELEKTRIK BAGI 20 UNIT RUMAH ROSAK DI PPRT LOBAK, SEREMBAN	MULA – 31.7.2023 SIAP – 19.11.2023	475,850	100%
8	KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG DAN KERJA YANG BERKAITAN DI PPRT LOBAK, SEREMBAN	MULA – 31.7.2023 SIAP – 19.11.2023	184,600	100%
9	KERJA-KERJA MEMASANG JARING BESI DI PETAK TANGKI AIR DI PPRT LOBAK, SEREMBAN	MULA – 31.7.2023 SIAP – 19.11.2023	63,780	100%
10	KERJA-KERJA MENAIKTARAF PAIP RETIKULASI SERTA KERJA BERKAITAN DI DI PPRT LOBAK, SEREMBAN	MULA – 20.9.2023 SIAP – 15.11.2023	102,350	20%
11	KERJA-KERJA MEMASANG MS GRILL DAN MENUKAR PINTU SEDIADA DI DISTRIBUTION BOARD (DB) DI PPRT LOBAK, SEREMBAN	MULA – 30.8.2023 SIAP – 27.9.2023	35,800	100%



MEMBAIKPULIH DAN KERJA PENGUKUHAN CERUN DI KWSN PBT – RMK12

(Kelulusan 14.6.2023)

RM 2,500,000.00

BIL	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS(%)
1	Kerja – Kerja Pembaikan Tebing Jalan Serta lain-Lain Kerja Berkaitan di Jalan S2 H20, Park Avenue Seremban 2, Negeri Sembilan.	MULA - 6.11.2023 SIAP – 21.04.2024	1,699,770.00	5%

GERAI PENJAJA : MyKiosk@KPKT – RM900,000.00 (kelulusan 14.6.2023)

BIL	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS(%)
1	Membina Baru 5 Unit Kiosk di Dataran Seremban , MB Seremban.	-	-	BATAL
2	Membina Baru 5 Unit Kiosk di Lorong Seni , MB Seremban.	-	-	BATAL
3	Membina Baru 5 Unit Kiosk di Jalan Utam Singh @ Pasar Warisan, MB Seremban.	MULA – 07.8.2023 SIAP – 30.10.2023	74,950.00	90%
4	Membina Baru 5 Unit Kiosk di Taman Tasik Seremban , MB Seremban.	MULA – 07.8.2023 SIAP – 30.10.2023	74,850.00	95%
5	Membina Baru 5 Unit Kiosk di berhampiran Rumah Kediaman Menteri Besar, MB Seremban.	-	-	BATAL
6	Membina Baru 12 Unit Kiosk di Dataran Centrio , MB Seremban.	MULA – 30.8.2023 SIAP – 21.11.2023	179,500.00	60%
7	Membina Baru 18 Unit Kiosk di Dataran Senawang , MB Seremban.	MULA – 30.8.2023 SIAP – 21.11.2023	269,500.00	60%
8	Membina Baru 5 Unit Kiosk di Dataran Rantau , MB Seremban.	-	-	BATAL
9	Membina Baru 5 Unit Kiosk di Dataran Nilai, MB Seremban.	MULA - 05.09.2023 SIAP - 31.10.2023	RM 72,800.00	20%
10	Membina Baru 5 Unit Kiosk di Nilai 3 , MB Seremban.	MULA - 05.09.2023 SIAP - 28.11.2023	RM 73,000.00	20%

SENARAI 16/23 (GERAI MADANI) (kelulusan 24.7.2023)

BIL	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS(%)
1	Naiktaraf Kiosk Stadium Tuanku Abdul Rahman, Paroi, MB Seremban	Mula- 14.11.2023 Siap – 4.3.2024	493,495.00	0%

PROJEK PEMBANGUNAN KAMPUNG BARU CINA

(kelulusan 26.7.2023)

BIL	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS(%)
1	Kerja – kerja membina pentas tetap di Kampung Baru Mambau, Seremban, Negeri Sembilan	MULA – 02.10.2023 SIAP – 19.02.2024	274,800.00	5%

PERUNTUKAN BP1 DI KAWASAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN (PBT) TAHUN 2023- SENARAI 19

BIL	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS(%)
1	KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PONDOK PERHENTIAN BAS SERTA KERJA BERKAITAN DI JALAN SUNGAI GADUT - RANTAU, SEREMBAN	MULA – 5.10.2023 SIAP – 30.11.2023	50,000	80%
2	KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH TEMBOK PENAHAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI NO. 2255, TAMAN GURU RASAH, SEREMBAN	MULA – 5.10.2023 SIAP – 16.11.2023	50,000	100%
3	MEMBAIKPULIH LONGKANG DAN CERUN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN SULIANA 2, SEREMBAN	MULA – 5.10.2023 SIAP – 29.11.2023	50,000	10%
4	MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA BERKAITAN DI TAMAN PINGGIRAN GOLF DAN TAMAN PAROI JAYA, SEREMBAN	MULA – 5.10.2023 SIAP – 29.11.2023	50,000	10%
5	KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LORONG BELAKANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN PERMAI 2, SEREMBAN	MULA – 5.10.2023 SIAP – 30.11.2023	50,000	10%
6	KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA BERKAITAN DI TAMAN ZAHRAH DAN YANG BERHAMPIRAN, SEREMBAN	MULA – 5.10.2023 SIAP – 30.11.2023	50,000	100%
7	KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA BERKAITAN DI LORONG BELAKANG OFF JALAN RASAH, SEREMBAN	MULA – 5.10.2023 SIAP – 30.11.2023	50,000	10%
8	KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN PERMAI DAN YANG BERHAMPIRAN, SEREMBAN	MULA – SIAP –	50,000	80%
9	KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN SEREMBAN JAYA, SEREMBAN	MULA – 5.10.2023 SIAP – 30.11.2023	50,000	80%
10	KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN SRI KASIH, SEREMBAN	MULA – 5.10.2023 SIAP – 30.11.2023	50,000	15%

PERUNTUKAN BP1 DI KAWASAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN (PBT) TAHUN 2023- SENARAI 19

BIL	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS(%)
11	KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH KERB SERTA KERJA BERKAITAN DI TAMAN PINGGIRAN SENAWANG, SEREMBAN	MULA – 5.10.2023 SIAP – 30.11.2023	50,000	5%
12	CADANGAN MEMBAIKPULIH DAN MENYELENGGARA LONGKANG SERTA KERJA BERKAITAN DI TAMAN DESA RHU, SIKAMAT	MULA – 5.10.2023 SIAP – 16.11.2023	50,000	5%
13	MEMBINA LALUAN PEJALAN KAKI DI GELANGGANG BOWLING PAROI JAYA	MULA – 5.10.2023 SIAP – 29.11.2023	50,000	100%
14	MEMBAIKI KEROSAKAN GELANGGANG FUTSAL TAMAN DESA KASIA, BANDAR BARU NILAI	MULA – SIAP –	50,000	Dlm proses lantikan
15	MEMBAIKI KEROSAKAN GELANGGANG FUTSAL NILAI PERDANA	MULA – SIAP –	50,000	Dlm proses lantikan
16	KEROSAKAN GELANGGANG FUTSAL TAMAN KOBENA, SENAWANG	MULA – SIAP –	50,000	Dlm proses lantikan
17	MEMBAIKI TABLE TOP, MEMASANG KEMASAN LANTAI DAN MEMBAIKI LONGKANG DI PASAR MANTIN	MULA – 21.11.2023 SIAP – 16.01.2024	49,951.25	8%
18	MEMBAIKI PAGAR KELILING DI PASAR MANTIN	MULA – 25.10.2023 SIAP – 20.12.2023	49,988.18	30%
19	MEMBAIKI TABLE TOP, MEMASANG KEMASAN LANTAI DAN MEMBAIKI LONGKANG DI PASAR SEMENTARA SEMARAK	MULA – 25.10.2023 SIAP – 20.12.2023	49,861.92	30%
20	MEMBEKAL DAN MEMASANG ROLLER SHUTTER SERTA KERJA BERKAITAN DI PASAR BROGA, MB SEREMBAN	MULA – 08.11.2023 SIAP – 03.01.2024	49,989.20	10%

SENARAI 21
- RM1,740,000.00

PERUNTUKAN BP1 DI KAWASAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN (PBT) TAHUN 2023- SENARAI 21

BIL	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS(%)
1	Menaiktaraf Lampu Jalan LED Di Jalan Persiaran Desa Rhu 1, Taman Desa Rhu, MB Seremban	MULA – 4.11.2023 SIAP – 12.12.2023	50,000	5%
2	Menaiktaraf Lampu Jalan LED Di Jalan Persiaran Cengal & Jalan Cengal 3, Taman Ampangan, MB Seremban	MULA – 4.11.2023 SIAP – 12.12.2023	50,000	5%
3	Menaiktaraf Lampu Jalan LED Di Jalan Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi, MB Seremban	MULA – 4.11.2023 SIAP – 12.12.2023	50,000	5%
4	Menaiktaraf Lampu Jalan LED Di Jalan Persiaran Palma Jaya, Taman Palma Jaya Perdana, MB Seremban	MULA – 4.11.2023 SIAP – 12.12.2023	50,000	5%
5	Menaiktaraf Lampu Jalan LED Di Taman Kemuning, Seremban, MB Seremban	MULA – 4.11.2023 SIAP – 12.12.2023	50,000	5%
6	Menaiktaraf Lampu Jalan LED Di Kawasan Perniagaan Taman Tuanku Jaafar, Seremban, MB Seremban	MULA – 4.11.2023 SIAP – 12.12.2023	50,000	5%
7	Menaiktaraf Lampu Jalan LED Di Kawasan Tapak Pasar Malam Taman Tuanku Jaafar, Seremban, MB Seremban	MULA – 4.11.2023 SIAP – 12.12.2023	50,000	5%
8	Menaiktaraf Lampu Jalan LED Di Kawasan Perniagaan Taman Merpati & Jalan Bukit Emas 4, Seremban, MB Seremban	MULA – 4.11.2023 SIAP – 12.12.2023	50,000	5%
9	Menaiktaraf Lampu Jalan LED Di Taman Zaitun, Ampangan, Seremban, MB Seremban	MULA – 4.11.2023 SIAP – 12.12.2023	50,000	5%
10	Menaiktaraf Lampu Jalan LED Di Millenium Square 2, Lobak Seremban, MB Seremban	MULA – 4.11.2023 SIAP – 12.12.2023	50,000	5%

PERUNTUKAN BP1 DI KAWASAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN (PBT) TAHUN 2023- SENARAI 21

BIL	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS(%)
11	Menaiktaraf Lampu Jalan LED Di Millenium Square, Lobak Seremban, MB Seremban	MULA – 4.11.2023 SIAP – 12.12.2023	50,000	5%
12	Menaiktaraf Lampu Jalan LED Di Jalan Saujana Prima, Seremban 2, MB Seremban	MULA – 4.11.2023 SIAP – 12.12.2023	50,000	5%
13	Menaiktaraf Lampu Jalan LED Di Jalan Persiaran S2/A3, Seremban 2, MB Seremban	MULA – 4.11.2023 SIAP – 12.12.2023	50,000	5%
14	Menaiktaraf Lampu Jalan LED Di Jalan Persiaran S2/A4, Seremban 2, MB Seremban	MULA – 4.11.2023 SIAP – 12.12.2023	50,000	5%
15	Cadangan Kerja Menaiktaraf Pencahayaan Lampu Jalan LED Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Jalan BBN 6/3, Desa Cempaka, Bandar Baru Nilai, MB Seremban	MULA – 4.11.2023 SIAP – 12.12.2023	50,000	5%
16	Cadangan Kerja Menaiktaraf Pencahayaan Lampu Jalan LED Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Jalan BBN 1/If, Bandar Baru Nilai, MB Seremban	MULA –16.11.2023 SIAP – 14.12.2023	50,000	5%
17	Cadangan Kerja Menaiktaraf Pencahayaan Lampu Jalan LED Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Jalan Square Utama, Nilai Square, Bandar Baru Nilai, MB Seremban	MULA –16.11.2023 SIAP – 14.12.2023	50,000	5%
18	Cadangan Kerja Menaiktaraf Pencahayaan Lampu Jalan LED Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Jalan Square Dan Jalan Nilai Square 1, Bandar Baru Nilai, MB Seremban	MULA –16.11.2023 SIAP – 14.12.2023	50,000	5%
19	Cadangan Kerja Menaiktaraf Pencahayaan Lampu Jalan LED Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Jalan Nilai Square 2,3,4,5 & 6, Nilai Square, Bandar Baru Nilai, MB Seremban	MULA –16.11.2023 SIAP – 14.12.2023	50,000	5%
20	Menaiktaraf Lampu Jalan LED Di Jalan Haruan 1/3, Seremban 2, MB Seremban	MULA –16.11.2023 SIAP – 14.12.2023	50,000	5%

PERUNTUKAN BP1 DI KAWASAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN (PBT) TAHUN 2023- SENARAI 21

BIL	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS(%)
21	Menaiktaraf Gelanggang Futsal Di Taman Bukit Margosa, MB Seremban	MULA –22.11.2023 SIAP – 19.12.2023	50,000	5%
22	Penurapan Jalan Di Lot Kedai Majlis Bandaraya Seremban Kg. Panchor, MB Seremban	MULA –14.11.2023 SIAP – 8.1.2024	30,000	10%
23	Membina Semula Tandas Awam Di Lot Kedai Majlis Bandaraya Seremban Kg. Panchor, MB Seremban	MULA –14.11.2023 SIAP – 8.1.2024	50,000	5%
24	Memperbaiki Dan Menurap Jalan Yang Rosak Di Lorong-Lorong Utama Si Taman Panchor Jaya Fasa 4, MB Seremban	MULA –14.11.2023 SIAP – 8.1.2024	30,000	5%
25	Memperbaiki Dan Menambah Kemudahan Permainan Di Taman Permainan Taman Panchor Jaya Fasa 4, MB Seremban	MULA –22.11.2023 SIAP – 19.12.2023	20,000	5%
26	Membina Gerai Penjaja Bagi Menempatkan Peniaga-Peniaga Di Sepanjang Jalan Di Bandar Tasik Senangin, MB Seremban		50,000	Dalam proses lantikan
27	Pembaikan Dan Baikpulih Longkang Dan Aliran Longkang Di Rumah Rakyat Pantai, MB Seremban	MULA –14.11.2023 SIAP – 8.1.2024	20,000	10%
28	Menurap Semula Jalan Yang Berlubang Atau Rosak Di Rumah Rakyat Pantai, MB Seremban	MULA –14.11.2023 SIAP – 8.1.2024	20,000	10%
29	Memasang Lampu Jalan Di Lorong 1, Rumah Rakyat Pantai, MB Seremban	MULA –27.11.2023 SIAP – 25.12.2023	20,000	5%
30	Baikpulih Padang Futsal Taman Panchor Jaya, MB Seremban	MULA –22.11.2023 SIAP – 19.12.2023	50,000	5%

PERUNTUKAN BP1 DI KAWASAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN (PBT) TAHUN 2023- SENARAI 21

BIL	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS(%)
31	Membina Gelanggang Sepak Takraw Di Kawasan (Perkarangan) Balai Raya Pusat Khidmat ADUN Lenggeng Panchor Jaya, MB Seremban	MULA –22.11.2023 SIAP – 19.12.2023	50,000	0%
32	Menukar Lampu Jalan Lama Ke Lampu Jalan Jenis LED Di Sekitar Tapak Pasar Malam Seremban, MB Seremban	MULA – 4.11.2023 SIAP – 12.12.2023	50,000	0%
33	Menukar Lampu Jalan LED Di Jalan Haruan 4, Jalan Haruan 4/4 Dan Jalan Haruan 4/6, MB Seremban	MULA – 4.11.2023 SIAP – 12.12.2023	50,000	0%
34	Pemasangan Railing Jambatan Dan Menurap Semula Jalan Raya Di Taman Serunai, MB Seremban	MULA –14.11.2023 SIAP – 8.1.2024	50,000	0%
35	Menurap Semula Jalan Raya Di Jalan Belimbing Perdana Ke Taman Bukit Kelisa, MB Seremban	-	100,000	SH Tutup Pada 24/11/2023
36	Menukar Lampu-Lampu Jalan LED Di Rasah Jaya, MB Seremban	MULA – 4.11.2023 SIAP – 12.12.2023	50,000	0%
37	Membaik Pulih Longkang Serta Kerja Berkaitan Di Kampung Pasir, Seremban, MB Seremban	MULA –16.11.2023 SIAP – 14.12.2023	50,000	0%

SENARAI 22
- RM900,000.00

PERUNTUKAN BP1 DI KAWASAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN (PBT) TAHUN 2023- SENARAI 22

BIL	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS(%)
1	Pembinaan Tapak Futsal Di Padang Permainan Taman Bunga Raya, Mantin, MB Seremban	-	50,000	Dalam proses lantikan
2	Kerja Penyelenggaraan Dan Pembaikan Laluan Pejalan Kaki Serta Kerja2 Berkaitan Di Taman Desa Kolej, Bandar Baru Nilai.MB Seremban.	-	50,000	Dalam proses lantikan
3	Pemasangan Lampu Jalan Di Kawasan Perindustrian Ringan Jalan Tun Dr Ismail, MB Seremban	MULA –28.11.2023 SIAP – 26.12.2023	50,000	0%
4	Kerja-Kerja Membaikpulih Cerun Dan Lain-Lain Kerja Berkaitan Di Rumah Rakyat Rasah Mambau, MB, Seremban	-	100,000	Dalam proses lantikan
5	Pembinaan Jalan Masuk Ke Tanah Perkuburan Seremban 2 Height, MB Seremban	MULA 27.11.2023 SIAP 08.01.2024	50,000	0%
6	Cadangan Mengecat Dinding Dan Membaikpulih Bumbung Serta Yang Berkaitan Di Laluan Pejalan Kaki KTM , MB Seremban	MULA –27.11.2023 SIAP – 8.1.2024	50,000	0%
7	Memasang Lampu Bagi Pencahayaan Laluan Pejalan Kakui Di Taman Tasik Seremban, Mb Seremban	MULA –28.11.2023 SIAP – 26.12.2023	50,000	0%
8	Penyelenggaraan Dan Pembaikan Gelanggang Futsal Taman Panchor Jaya Fasa 7 Dan 8, MB Seremban	-	50,000	Dalam proses lantikan
9	Menaiktaraf Tempat Letak Kenderaan di Gerai Taman Semarak, MB Seremban.	-	50,000	Dalam proses lantikan
10	Pembaikan Tandas Awam Di Gerai Taman Semarak, MB Seremban	-	50,000	Dalam proses lantikan

PERUNTUKAN BP1 DI KAWASAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN (PBT) TAHUN 2023- SENARAI 22

BIL	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS(%)
11	Menaiktaraf Tangga Laluan Masuk Ke Gerai Seremban Jaya, MB Seremban	-	50,000	Dalam proses lantikan
12	Kerja-Kerja Membaikpulih Kerosakan Am Di Dewan Orang Ramai Taman Tuanku Jaafar, MB Seremban	MULA – 27.11.2023 SIAP – 26.12.2023	50,000	0%
13	Menaiktaraf Lampu Solar Di Taman Permainan Taman Kekwa, MB Seremban	MULA – 27.11.2023 SIAP – 26.12.2023	50,000	0%
14	Menaiktaraf Lampu Solar Di Taman Permainan Taman Nusa Intan, MB Seremban.	-	50,000	Dalam proses lantikan
15	Pembinaan Gabion Penahan Cerun Di kawasan Perindustrian Tuanku Jaafar, MB Seremban	MULA – 29.11.2024 SIAP – 24.1.2024	50,000	0%



UPEN, P62

SENARAI 1/2023

(kelulusan 27.1.2023)

BIL	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS(%)
1	Kerja-kerja Menaiktaraf Pencahayaan, Lampu di Taman Tasik Seremban dan lain-lain kerja berkaitan di Seremban.	MULA – 10.7.2023 SIAP – 3.9.2023	269,040.00	100%
2	Kerja-kerja Pembangunan Taman permainan Mega Kanak-Kanak di Taman Tasik Seremban dan lain-lain kerja berkaitan di Seremban.	MULA 13.07.2023 SIAP 06.09.2023	286,825.00	100%

**INISIATIF KEMUDAHAN
RAKYAT (IKR) –
RM 4,620,000.00**

INISIATIF KEMUDAHAN RAKYAT (IKR)

BIL	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS(%)
1	KERJA-KERJA MEMBINA GELANGGANG FUTSAL DI TAMAN DESA RHU, SEREMBAN	MULA – SIAP –	-	PENYEDIAAN DOK SH
2	KERJA-KERJA MENAIKTARAF DAN MEMBAIKPULIH TEMPAT PENONTON DI LITAR GOKART SEREMBAN	MULA – SIAP –	-	PENYEDIAAN DOK SH
3	KERJA-KERJA MEMBINA LONGKANG DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI TANAH PERKUBURAN ISLAM FOREST HEIGHTS, SEREMBAN	MULA – 15.11.2023 SIAP – 5.3.2024	RM 194,750.00	5%
4	KERJA-KERJA PEMASANGAN LAMPU SOLAR DI TAPAK PENJAJA DUSUN NYIOR, SEREMBAN	MULA – SIAP –	-	PENYEDIAAN DOK SH
5	KERJA-KERJA MEMBINA GELANGGANG FUTSAL DI TAMAN KEMUNING, SENAWANG	MULA – SIAP –	-	PENYEDIAAN DOK SH
6	KERJA-KERJA PEMBINAAN TITI DI ARKED SENAWANG, SEREMBAN	MULA – SIAP –	-	PENYEDIAAN DOK SH
7	KERJA-KERJA MEMBAIKI KEBOCORAN BUMBUNG DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI KOMPLEKS SUKAN NEGERI, PAROI	MULA – SIAP –	-	PENILAIAN SEBUTHARGA
8	KERJA-KERJA MEMBAIKI PADANG DI TAMAN PAROI JAYA	MULA – SIAP –	-	PENYEDIAAN DOK SH
9	KERJA-KERJA PEMBAIKAN AM DI STADIUM HOKI DATO' HAJI MOHD SAID, SEREMBAN 2	MULA – SIAP –	-	PENYEDIAAN DOK SH
10	KERJA-KERJA PEMBAIKAN AM DI KOMPLEKS AKUATIK, PAROI	MULA – SIAP –	-	PENILAIAN SEBUTHARGA

INISIATIF KEMUDAHAN RAKYAT (IKR)

BIL	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS(%)
11	KERJA-KERJA MENAIKTARAF TAMAN PERMAINAN DI TAMAN SAUJANA DUTA SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DALAM KAWASAN MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN	MULA – SIAP –	-	(KKS)
12	KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH KEROSAKAN AM DI DEWAN ORANG RAMAI TAMAN SEREMBAN JAYA	MULA – SIAP –	-	PENYEDIAAN SST
13	KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH KEROSAKAN AM DI DEWAN ORANG RAMAI TAMAN TASIK JAYA	MULA – 5.10.2023 SIAP – 30.11.2023	50,000	5%
14	KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH KEROSAKAN AM DI DEWAN ORANG RAMAI KG FELDA SENDAYAN	MULA – SIAP –	-	PENYEDIAAN SST
15	KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH KEROSAKAN AM DI DEWAN ORANG RAMAI SIKAMAT	MULA – SIAP –	-	PENYEDIAAN SST
16	KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH KEROSAKAN AM DI DEWAN ORANG RAMAI TAMAN KELAB TUANKU	MULA – SIAP –	-	PENYEDIAAN SST
17	KERJA-KERJA MENAIKTARAF TAMAN PERMAINAN DAN PADANG BOLA DI TAMAN DESA RHU SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DALAM KAWASAN MBS	MULA – SIAP –	-	PENYEDIAAN DOK SH
18	KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH KEROSAKAN AM DI DEWAN ORANG RAMAI KG BARU RAHANG	MULA – 5.10.2023 SIAP – 30.11.2023	50,000	5%
19	KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH KEROSAKAN AM DI DEWAN KOMUNITI MANTAU	MULA – 5.10.2023 SIAP – 4.11.2023	20,000	100%
20	KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH KEROSAKAN AM DI DEWAN KOMUNITI BATANG BENAR	MULA – 31.10.2023 SIAP – 5.12.2023	-	5%

INISIATIF KEMUDAHAN RAKYAT (IKR)

BIL	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS(%)
21	KERJA-KERJA MENAIKTARAF TAMAN PERMAINAN DI TAMAN BAYU FOREST HEIGHT SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI DALAM KAWASAN MBS	MULA – SIAP –	-	(KKS)
22	KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH KEROSAKAN AM DI DEWAN ORANG RAMAI KG LBJ	MULA – 31.10.2023 SIAP – 5.12.2023	-	5%
23	KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH KEROSAKAN AM DI DEWAN SERBAGUNA DESA CEMPAKA	MULA – 25.10.2023 SIAP – 20.12.2023	-	5%
24	KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH KEROSAKAN AM DI DEWAN ORANG RAMAI LENGGENG	MULA – 31.10.2023 SIAP – 5.12.2023	-	5%
25	KERJA-KERJA MENAIKTARAF TAMAN PERMAINAN DI VILLA 29 RASAH KEMAYAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI DALAM KAWASAN MBS	MULA – SIAP –	-	(KKS)
26	KERJA-KERJA MENAIKTARAF TAMAN PERMAINAN DI TAMAN GREEN STREET HOME SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI DALAM KAWASAN MBS	MULA – SIAP –	-	PENYEDIAAN DOK SH
27	KERJA-KERJA PEMBINAAN JALAN BARU DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN GEDUNG LALANG 3 SERTA JALAN GEDUNG LALANG 50, SEREMBAN	MULA – SIAP –	-	SH TUTUP 27.11.2023
28	KERJA-KERJA PEMBINAAN JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI KG SINGH, SEREMBAN	MULA – SIAP –	-	PENYEDIAAN DOK SH
29	KERJA-KERJA PEMBINAAN JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN BERSEBELAHAN TAMAN SRI PAROI, SEREMBAN	MULA – SIAP –	-	SH TUTUP 5.12.2024
30	KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH KEROSAKAN BUMBUNG DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI STADIUM TUANKU ABDUL RAHMAN, PAROI	MULA – SIAP –	-	PENYEDIAAN DOK SH

INISIATIF KEMUDAHAN RAKYAT (IKR)

BIL	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS(%)
31	KERJA-KERJA MENAIKTARAF PADANG PERMAINAN DI TAMAN SEREMBAN JAYA FASA 5, SEREMBAN	MULA – SIAP –	-	PENYEDIAAN DOK SH
32	KERJA-KERJA MEMBINA LONGKANG DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI TANAH PERKUBURAN ISLAM SEREMBAN 2 HEIGHTS	MULA – SIAP –	-	PENYEDIAAN SST
33	KERJA-KERJA PEMASANGAN LAMPU SOLAR DI TAPAK PERKUBURAN SEREMBAN 2 HEIGHTS	MULA – SIAP –	-	PENYEDIAAN DOK SH
34	KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM SALIRAN DI LOT 29507, LORONG JIBOI BARU 23	MULA – SIAP –	-	PENYEDIAAN DOK SH



SAMBUNGAN PROJEK 2022

RINGKASAN LAPORAN PROJEK 2022

PERUNTUKAN	BILANGAN PROJEK	JUMLAH PERUNTUKAN (RM)	STATUS				BELANJA	
			PERANCANGAN	PELAKSANAAN	SIAP	%SIAP	RM	%
MARRIS	306 (DETAIL A)	135,595,250	4 3 – TELAH IKLAN 1 – PENYEDIAAN DOK SH / TENDER	0	302	98.7	123,006,740.00	90.7
KPKT	48	2,906,550.00	0	0	48	100	2,862,966.68	98.5
P61	1	150,000.00	0	0	1	100	98,999.60	66
PERUNTUKAN BANDAR SELAMAT (KDN)	4	400,000.00	0	0	4	100	375,020.00	93.7
MAJLIS	5	5,010,620	0	0	5	100	5,010,620	100
JUMLAH	364	144,062,420	4	0	360	98.9	131,354,346.28	91.2

DETAIL A	
KATEGORI	BILANGAN
TENDER	26
SEBUTHARGA / LANTIKAN TERUS	198
UNDI	82

UPT BANGKOK
VICTOR LUTHERON

PROJEK MARRIS 2022

SENARAI PROJEK MARRIS SIRI 3/2022

TENDER LANTIKAN TERUS (NRSB) / TENDER TERBUKA

BIL	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS PROJEK
1	MENURAP JALAN DAN MENYELENGGARA JAMBATAN SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN TOK DAGANG, SEREMBAN.	-	-	DALAM TINDAKAN JURUKUR DAN JURUTERA PERUNDING
2	MENURAP SEMULA JALAN DAN MENYELENGGARA LONGKANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN TEMIANG, SEREMBAN	-	-	JWTNKUASA TENDER BERSIDANG PADA 22.11.2023 (DLM PROSES LANTIKAN)
3	MEMBAIKPULIH LONGKANG DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAWASAN INDUSTRI TASIK JAYA, SEREMBAN.	-	-	JWTNKUASA TENDER BERSIDANG PADA 22.11.2023 (DLM PROSES LANTIKAN)
4	CADANGAN MENYELENGGARA LONGKANG DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN BERHAMPIRAN PETRONAS JALAN JELEBU, SEREMBAN.	-	-	JWTNKUASA TENDER BERSIDANG PADA 22.11.2023 (DLM PROSES LANTIKAN)

KG BARU PAROI SEMASA




SENARAI PROJEK MARRIS KERJA TENDER

BIL	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS PROJEK
1.	MEMBAIKPULIH PEMBENTUNG DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI LORONG BELAKANG JALAN WARISAN PUTERI, BANDAR WARISAN PUTERI, SIKAMAT, SEREMBAN.	MULA – 3.7.2023 SIAP – 18.12.2023 EOT – 20.03.2023	RM 788,500.00	10% (utiliti mapping siap, Kelewatan sambungan rumah penduduk)



PROJEK SAMBUNG 2021

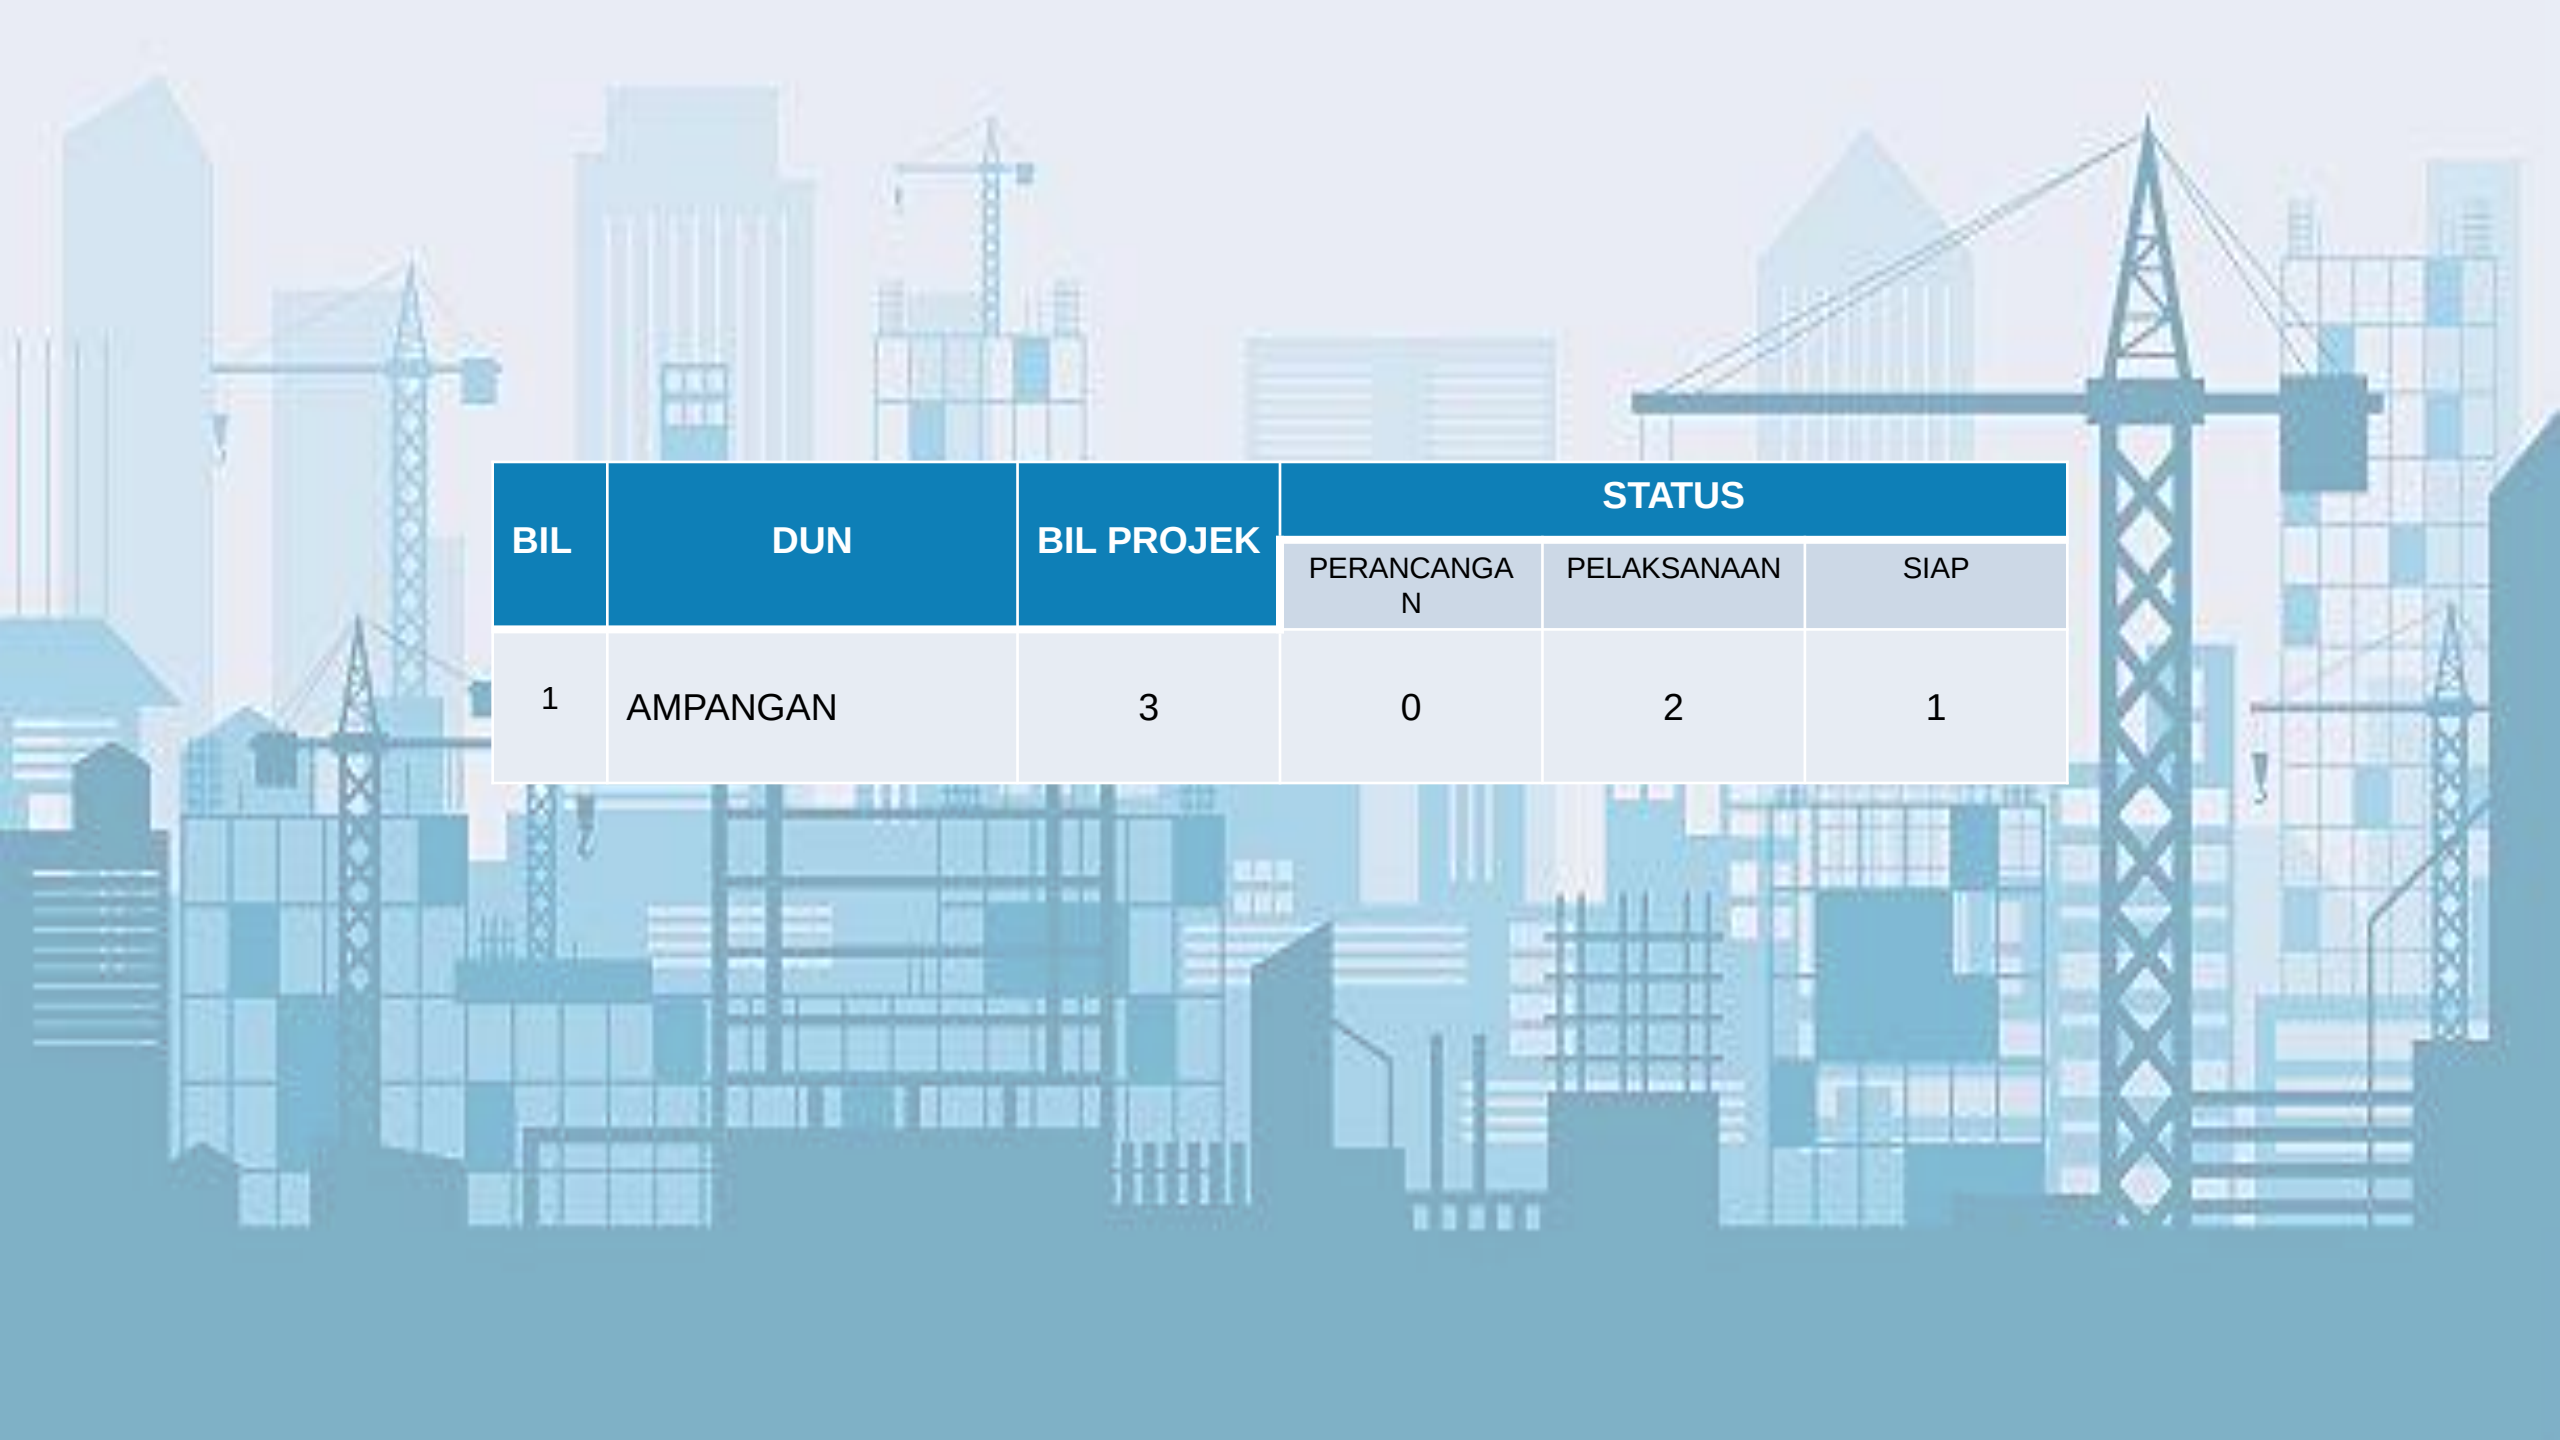


BIL	DUN	BIL PROJEK	STATUS		
			PERANCANGAN	PELAKSANAAN	SIAP
1	AMPANGAN	3	0	2	1

SENARAI PROJEK 2020


BIL	TAJUK	STATUS
1	PASAR BARU AMPANGAN DAN TEMPAT LETAK KENDERAAN BERTINGKAT BAGI MENGGANTIKAN PASAR LAMA DI TAPAK SEDIADA SEREMBAN, NSDK – (FASA 2), (PASAR KEKAL) . (PERUNTUKAN KPKT) (DILAKSANAKAN OLEH PIHAK JKR)	Kos Projek – RM 20,121,287.33 Tarikh Mula – 2.2.2021 Tarikh Siap – 31.7.2023 EOT No. 1 – 25.9.2023 EOT No.2 – 13.12.2023 Kemajuan : Jadual : 99.74% Sebenar : 92.20% (kerja-kerja external , jalan, longkang)
2	PEMBINAAN KOMPLEKS KOMUNITI AMPANGAN, NEGERI SEMBILAN. (PERUNTUKAN MEA)	Kos Projek – RM3,520,800.00 Tarikh Mula – 5.4.2021 Tarikh Siap – 4.4.2022 EOT No. 1 – 5.9.2022 EOT No. 2 – 4.3.2023 EOT No. 3 – 3.5.2023 EOT No. 4 – 29.11.2023 Kemajuan: Jadual :100% Sebenar :90% (Kerja-kerja Premix, concrete imprint, sambungan TNB,TM, SAINS, Aircond, Tangki Bomba, T&C Lif)



PEMBINAAN PASAR BARU AMPANGAN
SERTA TEMPAT LETAK KENDERAAN
BERTINGKAT DI TAPAK SEDIA ADA,
SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN.

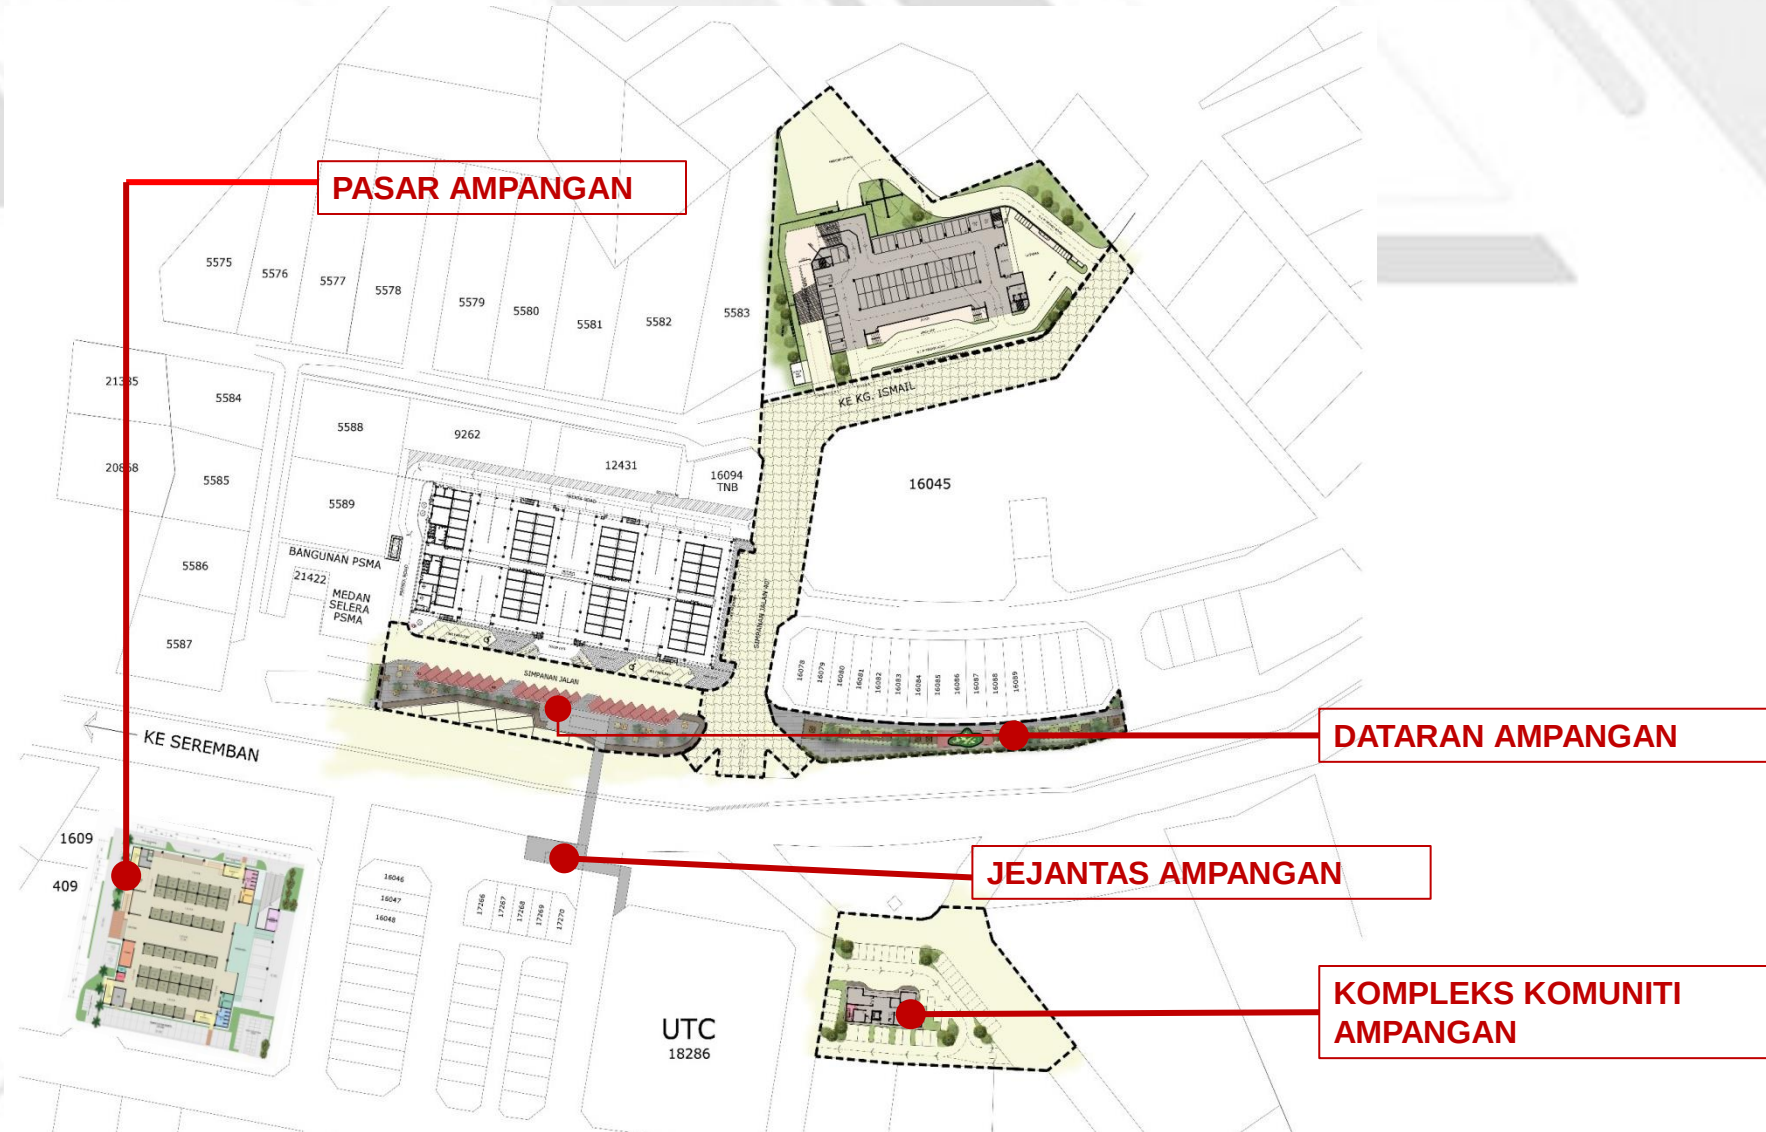



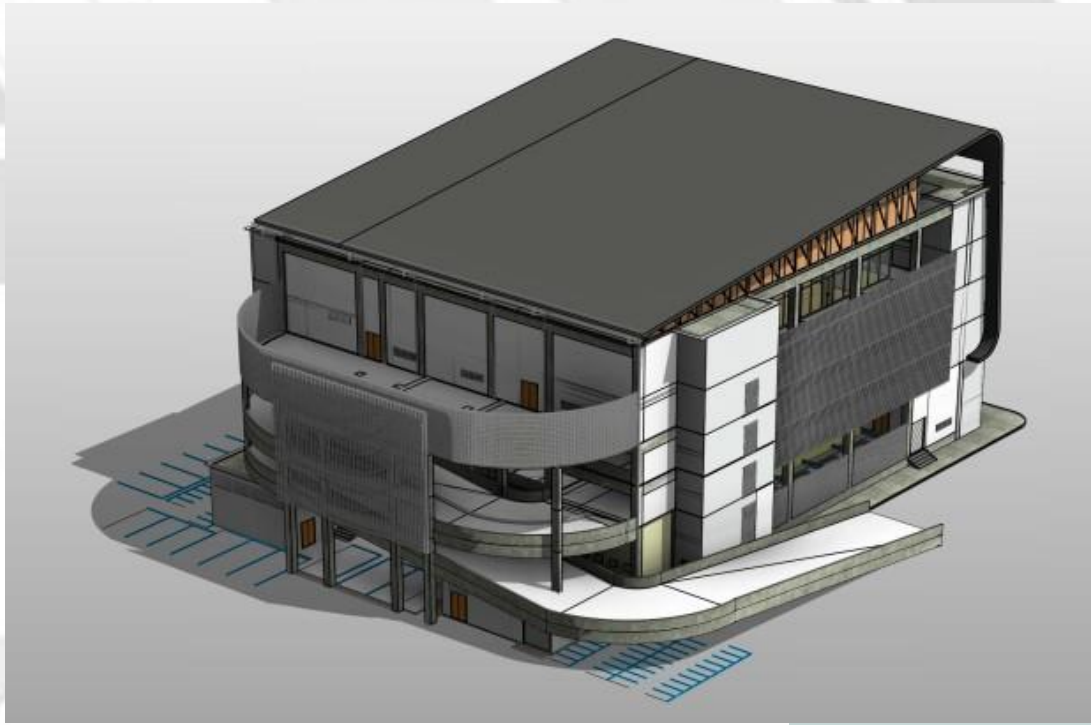

CADANGAN UNTUK PASAR BARU AMPANGAN DAN TEMPAT LETAK KENDERAAN BERTINGKAT BAGI MENGGANTIKAN PASAR LAMA DI TAPAK SEDIADA SEREMBAN,
NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS FASA 2 (PASAR KEKAL)



FRONT ELEVATION & RIGHT SIDE ELEVATION



Exterior



General Wall
9904 - Twilight
Jotashield Antifade Colours



Feature Wall
1998 - Spring Champagne
Jotashield Antifade Colours



Feature Wall
Jotun 2986 (Multicolour)
Jotashield Antifade Colours



Feature Wall
10406 - Golden Lily
Jotashield Antifade Colours



Feature Wall
5366 - Tai
Jotashield Antifade Colours

Metal & Wood



Door Leaf & Frame / Railing
0767 - Sensual Touch
Gardex Semi Gloss

Powder Coating



Window Frame/Louvers
Aluminium
Jotun Facade 1403 7047

*All colours reproduced are shown as close to actual paint colours as modern printing techniques allow. Where colour matching is critical, an applied sample is recommended.

Approved by:
Name: MOHD SHARIFFUDIN BIN MOHD SARDIN
Date: 17/4/22
Cawangan Arkitek
Ibu Pejabat JKR Malaysia
Reference : 2021-08-0245-NN-MM(mm2)

PROPOSAL 4

REAR ELEVATION & LEFT SIDE ELEVATION



Exterior



General Wall
9904 - Twilight
Jotashield Antifade Colours



Feature Wall
1998 - Spring Champagne
Jotashield Antifade Colours



Feature Wall
Jobun 2986 (Multicolour)
Jotashield Antifade Colours



Feature Wall
10406 - Golden Lily
Jotashield Antifade Colours



Feature Wall
5366 - Tar
Jotashield Antifade Colours

Metal & Wood



Door Leaf & Frame / Railing
0767 - Sensual Touch
Gardex Semi Gloss

Powder Coating



Window Frame/Louvers
Aluminium
Jotun Facade 1403 7047

*All colours reproduced are shown as close to actual paint colours as modern printing techniques allow. Where colour matching is critical, an applied sample is recommended.

Approved by : 
Name : MOHD SHARIFFUDIN BIN MOHD SAIDIN
Arkitak Kanan
Cawangan Arkitak
Date : 12/6/22 Ibu Pejabat JKR Malaysia

Reference : 2021-08-0245-NN-MM(mm2)

PROPOSAL 4

SEMASA



SEMASA



SEMASA





SEMASA





PEMBINAAN KOMPLEKS KOMUNITI AMPANGAN, NEGERI SEMBILAN.


PELAN LOKASI



LUAS TAPAK :
0.42 EKAR
(1,720
MSM)
MEI 2020

KERATAN A-A

CADANGAN TIDAK BERPAGAR (OPTION 2)

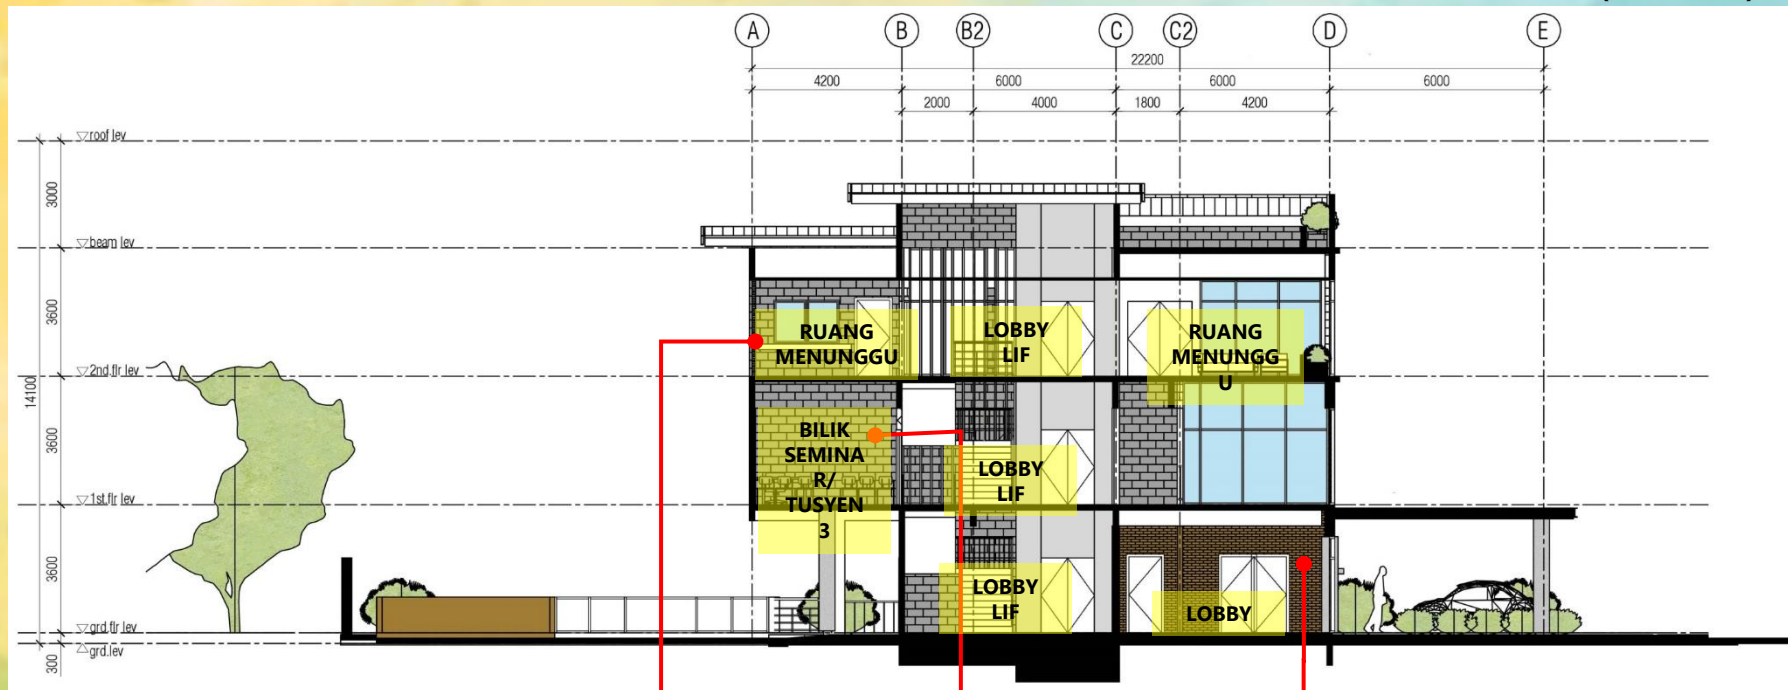

VENTILATION BLOCK
(STAIRCASE WALL)



EXPOSED BLOCK WALL




CLAY BRICK (WALL)


NOVEMBER
MEI 2020

KERATAN B-B


CADANGAN TIDAK BERPAGAR (OPTION 2)

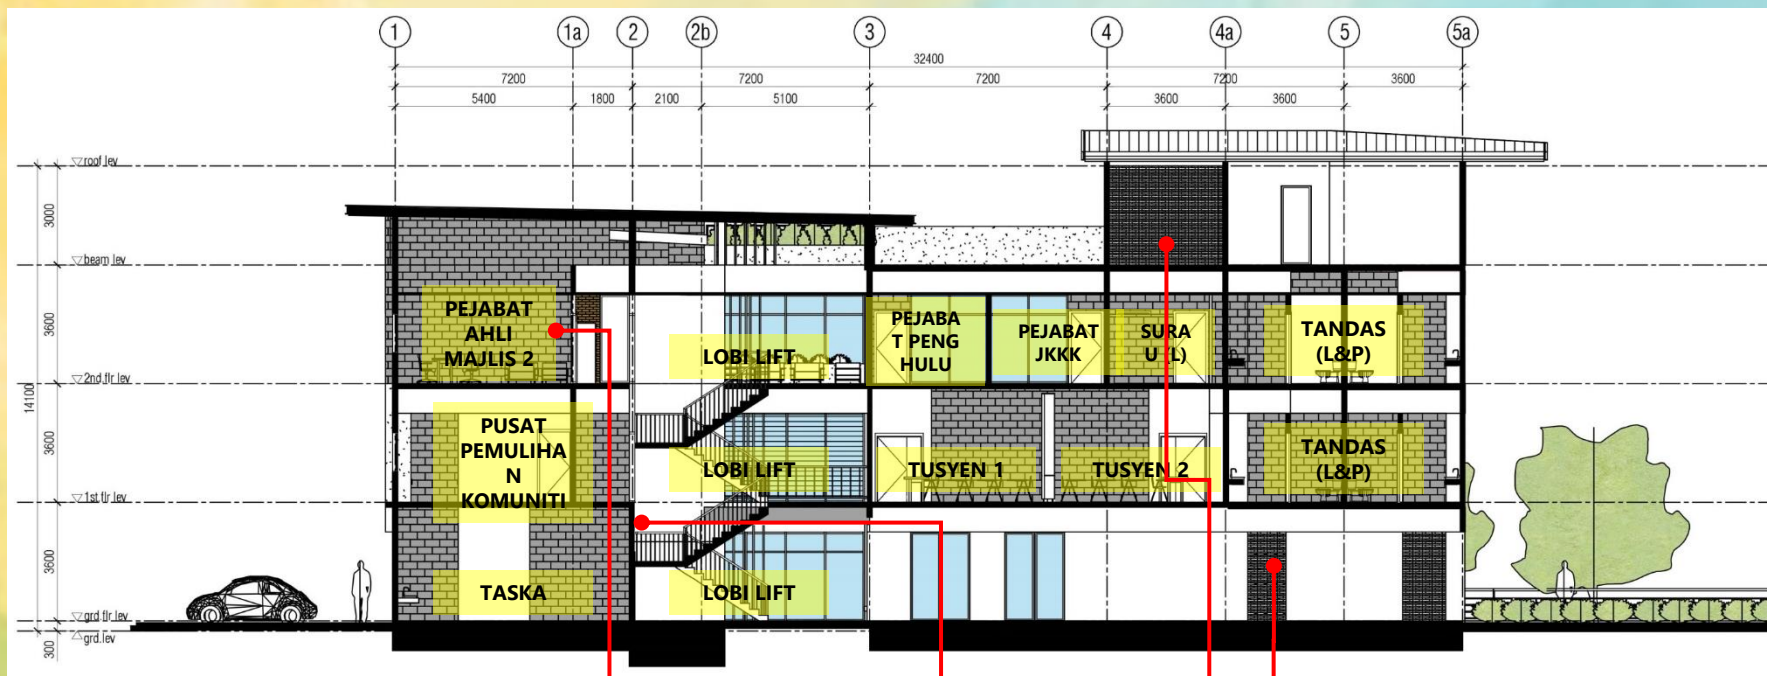

EXPOSED BLOCK
WALL



CLAY BRICK (WALL)



VENTILATION BLOCK
(WALL)

NOVEMBER
MEI 2020

PERPEKTIF

CADANGAN TIDAK BERPAGAR (OPTION 2)



MEI 2020



MEI 2020



CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN KOMPLEKS KOMUNITI AMPANGAN
DI ATAS LOT 16096, AMPANGAN,
DAERAH SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
UNTUK : MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN

PINDAAN REKABENTUK

02



PERPEKTIF

CADANGAN TIDAK BERPAGAR (OPTION 2)



MEI 2020

SEMASA



SEMASA



SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS)

BIL	TAJUK	MULA/SIAP	STATUS(%)	DUN
1	Cadangan kerja-kerja membaikpulih dan penyelenggaraan jambatan serta kerja yang berkaitan di Taman Tuanku Jaafar, Seremban , NSDK	06.09.2021 05.03.2023 (EOT 05.01.2024)	70% 15,100,000.00	PAROI
2	MENYELENGGARA LONGKANG, JAMBATAN DAN YANG BERKAITAN DI JALAN PERSIARAN DESA RHU 1, TAMAN DESA RHU, SIKAMAT, SEREMBAN.	29.8.2022 28.8.2023 (EOT 1 – 27.8.2024)	10% RM 2,468,875.00 (MENUNGGU MAKLUMAT DARI PIHAK UTILITI – KOS2 PENGALIHAN)	SIKAMAT

2. Cadangan kerja-kerja membaikpulih dan penyelenggaraan jambatan serta kerja yang berkaitan di Taman Tuanku Jaafar, Seremban , NSDK


SEBELUM



SEMASA



SEMASA

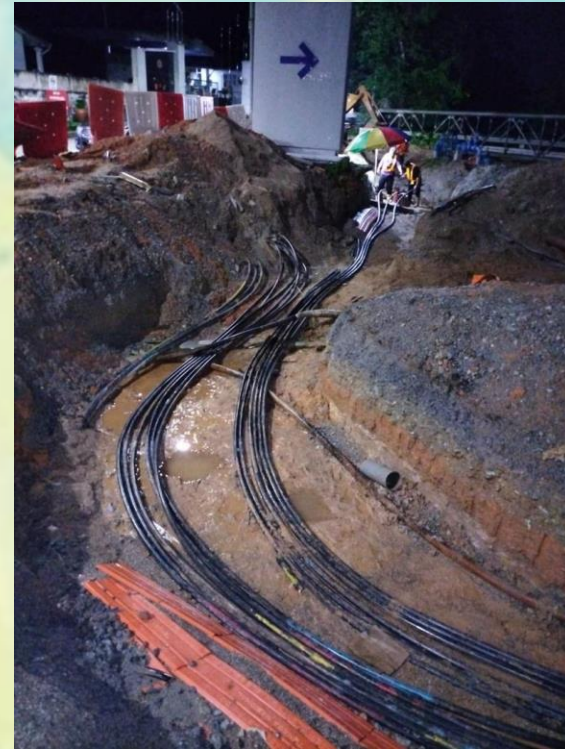

SEMASA

